



PRR-AÇORES

1º **RELATÓRIO**
PERIÓDICO DE
MONITORIZAÇÃO
TRIMESTRE
2023

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
3 de maio de 2023

FICHA TÉCNICA

Título

Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores – 1º Trimestre de 2023

Editor

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Endereço

Caminho do Meio, 58 – São Carlos

9701-853 Angra do Heroísmo

Tel.: +351 295 206 380

drepa@azores.gov.pt | prp.acores@azores.gov.pt

<https://portal.azores.gov.pt/web/drepe/prp>

Data de Edição

3 de maio de 2023

ÍNDICE

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	4
RESUMO MARCOS & METAS.....	7
AValiação DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	7
Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Desporto)	8
Investimento C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional). 12	
Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional).....	14
Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	16
Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural).....	18
Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego)	19
Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)	20
Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)	21
Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	22
Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	24
Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais)	26

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS

A Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE), enquanto órgão de coordenação técnica e de monitorização, designado pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 23/2021/A, de 3 de setembro, tem como competência a elaboração e apresentação aos órgãos de coordenação política e de acompanhamento, relatórios periódicos de monitorização e relatórios anuais de progresso, bem como responder às demais necessidades de informação desses órgãos.

Nestes termos, o cronograma estabelecido para a elaboração dos relatórios acima referidos é o seguinte:

- Relatórios Periódicos de Monitorização (Trimestrais) – **elaboração até ao último dia do mês seguinte ao final de cada trimestre**, com base exclusivamente nos Relatórios de Progresso (RP) dos Beneficiários Finais (BF), relativos ao ponto de situação dos marcos e metas desse trimestre e dos quatro trimestres seguintes;
 - Nota: os BF elaboram RP trimestrais até ao dia 10 do mês seguinte ao final de cada trimestre.
- Relatórios Anuais de Progresso – **elaboração até ao final de fevereiro do ano seguinte**, relativos a aspetos globais da gestão e da execução do PRR-Açores, incluindo, entre outras, questões relativas a ações de acompanhamento e auditoria; combate à corrupção, fraude, duplo financiamento e segregação de funções; ao princípio de não prejudicar significativamente o ambiente (DNSH) e estratégia de comunicação.

Este 6º Relatório Periódico de Monitorização, à semelhança dos anteriores, tem por base a informação inserida no Sistema de Informação do PRR (SI PRR) pelos BF, no início do mês de abril de 2023, relativa ao primeiro Relatório de Progresso Trimestral de 2023, referente aos onze investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência para os Açores.

Em termos da terminologia utilizada para a caracterização do “Estado” dos Marcos e Metas, a Estrutura de Missão Recuperação Portugal (EMRP) alterou, no Sistema de Informação do PRR (SI PRR), a designação “Cumprido” e “Não Cumprido” para “Completo” e “Não Completo”, de forma a alinhar com a terminologia utilizada pela Comissão Europeia no seu sistema de informação, FENIX, no qual os Estados Membros reportam os pontos de situação dos M&M, com a designação “Completed” e “Not Completed”.

O período de incidência reporta-se ao 1.º Trimestre de 2023, com uma análise que incide também sobre os Marcos e Metas dos Grupos A, B e C considerados “Não Completos” nos trimestres anteriores, e uma análise sobre os Marcos e Metas dos Grupos A, B e C a cumprir nos três trimestres seguintes (neste período, não foi dada, em SI PRR, a possibilidade de inserção de informação relativa ao 1.º Trimestre de 2024, de forma a permitir, como habitual, uma análise aos quatro trimestres seguintes).

Com base nas evidências dos indicadores dos Marcos e Metas a atingir, apresentadas pelos BF, que inclui o prazo contratualizado e os mecanismos de verificação constantes no [Acordo Operacional](#), o estado dos Marcos e Metas é classificado como “Completo” ou “Não Completo”, no que concerne aos Marcos e Metas do trimestre em análise no Relatório de Progresso e dos trimestres anteriores, e classificado como “Dentro do Prazo” ou “Atrasado” para os Marcos e Metas dos três trimestres seguintes, no caso específico deste relatório.

Independentemente do estado dos Marcos e Metas, o Beneficiário Intermediário estabelece uma avaliação, sobre a informação/evidências/dificuldades apresentadas pelos BF, que reflete se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, e que se traduz numa avaliação Favorável (●), Condiçãoada (●) ou Crítica (●).

Os marcos e metas do Grupo A, denominadas de “desembolso”, são aqueles cujo seu cumprimento viabiliza os pedidos de pagamento por parte da Comissão Europeia ao Estado Membro, e como tal, o seu cumprimento deverá ser rigoroso, não só na sua dimensão quantitativa, mas também qualitativa e temporal, cumprindo plenamente os objetivos que pretendiam alcançar e os requisitos contratuais e ambientais.

Os marcos e metas do Grupo B, funcionam como indicadores de monitorização do estado de execução dos investimentos, cujo cumprimento permite garantir o alcance dos marcos e metas do Grupo A, servindo de alerta na eventualidade de não serem cumpridos no calendário previamente definido.

Os marcos e metas do Grupo C, constam do anexo II do [Acordo Operacional](#), definidos pela Comissão Europeia, e funcionam como indicadores de monitorização associados a algumas metas do Grupo A, cuja monitorização será acompanhada adicionalmente nos prazos estabelecidos e, em alguns casos são coincidentes com marcos e metas do Grupo B.

A análise neste Relatório Periódico de Monitorização incidiu sobre o nível de execução de 80 Marcos e Metas, deste trimestre e dos três trimestres seguintes, incluindo os não completos em trimestres anteriores, com a distribuição temporal expressa na Tabela 1.

Tabela 1: Número de Marcos e Metas - RP 1º T. 2023

Metas	2021	1T 22	2T 22	3T 22	4T 22	1T 23	2T 23	3T 23	4T 23	Total
Grupo A	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5
Grupo B	4	4	3	3	11	7	1	13	15	61
Grupo C	-	2	-	1	2	1	1	-	7	14
Total	4	6	3	4	14	8	3	13	25	80

Neste Relatório Periódico de Monitorização surge também uma análise relacionada com os Marcos e Metas já cumpridos anteriormente, conforme consta na Tabela 2 e nas tabelas subsequentes, de análise individual dos investimentos.

Tabela 2: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023, com acumulado dos cumpridos

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
7	Grupo A	-	1	1	3	5	12
48	Grupo B	2	11	30	18	61	109
4	Grupo C	-	3	6	5	14	18
59*	Total	2*	15	37*	26	80	139

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 1.ºT de 2023 (59+2+37=98)

Assim, constata-se que já foram cumpridos 62% dos 98 marcos e metas dos Grupos A, B e C que deveriam estar concluídos até ao 1.ºT de 2023, o que representa, globalmente, um bom nível de execução dos investimentos do PRR-Açores.

No que concerne à análise pormenorizada do período em referência, no 1.ºT de 2023 não estavam previstos marcos de Grupo A, continuando por cumprir o marco A do investimento C10-

i04-RAA (Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores”), atendendo à não adjudicação do respetivo procedimento de contratação pública, por ausência de propostas. No 2.ºT 2023 está previsto um marco de Grupo A que se encontra dentro do prazo, e para o 4.ºT 2023 estão previstos três marcos de Grupo A, no estado “Atrasado”, sendo que terão de ser acompanhados e monitorizados com maior pormenor (dois do investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores e um do investimento C14-i03-RAA – Transição Energética nos Açores). No processo de reprogramação em curso dos investimentos do PRR nacional, ao nível dos Marcos e Metas do Grupo A, estas situações foram devidamente assinaladas.

Sobre os Marcos e Metas do Grupo B, dois foram considerados no estado completo e onze estão dentro do prazo, verificando-se trinta não completos e dezoito atrasados. No que concerne aos Marcos e Metas do Grupo C, três estão dentro do prazo, seis estão não completos e cinco estão atrasados.

Quer os quatro Marcos e Metas dos Grupos B que transitaram de 2021, quer os vinte e um de 2022, continuaram como não completos neste período.

Passados três meses do último relatório periódico de monitorização e atendendo à situação apresentada pelos diversos Beneficiários Finais, constata-se que persistem os mesmos constrangimentos que condicionam ou implicam algum atraso em certas medidas, essencialmente relacionados com fatores externos, como o aumento de preços, a falta de mão-de-obra, de matérias-primas ou de bens e serviços, que já se vinham a verificar na crise pandémica, mas agora agravados com os efeitos do conflito militar na Europa, o que vem enfatizar a necessidade de planeamento e de previsibilidade na gestão dos investimentos.

É no contexto dos constrangimentos acima identificados que resulta a avaliação expressa de seguida, enquanto, em paralelo, está a decorrer um processo de reprogramação do PRR, ao nível dos Marcos e Metas do Grupo A. Os dois critérios definidos pela Comissão Europeia para alteração da programação contratualizada são relativos a fatores externos, relacionados com a guerra e a inflação, que resultam em aumento de custos ou necessidade de adiamento de prazos, ou à correção pontual de textos iniciais, que importa agora clarificar, sendo que as justificações apresentadas pelos BF devem ser devidamente fundamentadas e evidenciadas.



RESUMO MARCOS & METAS

Resumo 6º RP - 1ºT 2023

TOTAL

80

Marcos & Metas					
Investimento	2021	2022	2023	Não completo/Atrasado	Completo/Dentro do prazo
C01-i08-RAA	2	17	17	36	
C02-i04-RAA	0	2	2	4	
C03-i04-RAA	1	2	4	5	2
C05-i04-RAA	0	1	1	2	
C05-i05-RAA	0	0	1		1
C06-i05-RAA	1	2	2	5	
C07-i05-RAA	0	0	2		2
C10-i04-RAA	0	1	2	2	1
C14-i03-RAA	0	2	5	6	1
C19-i06-RAA	0	0	10	3	7
C20-i02-RAA	0	0	3		3
Total Geral	4	27	49	63	17

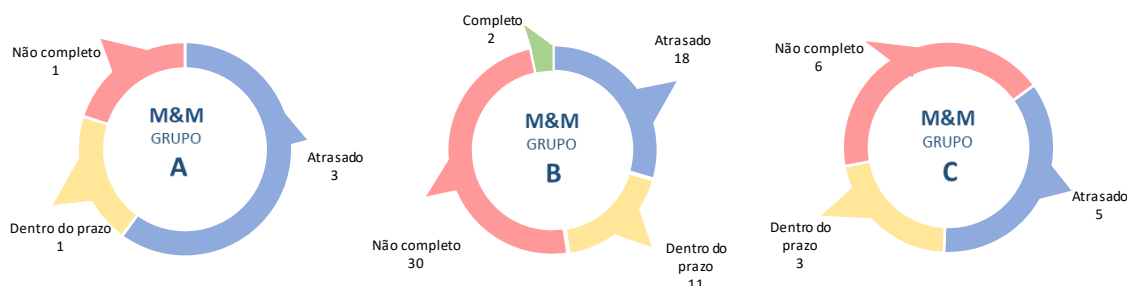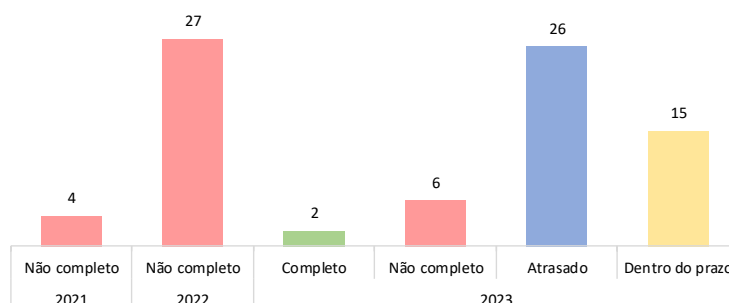

Completo	Dentro do prazo	Atrasado	Não completo	
0	0	12	24	C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
0	0	2	2	C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores
0	2	2	3	C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)
0	0	1	1	C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores
0	1	0	0	C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana
0	0	2	3	C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA
1	1	0	0	C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores
0	1	1	1	C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"
0	1	4	2	C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores
1	6	2	1	C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA
0	3	0	0	C20-i02-RAA - Educação digital (Açores)

AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS

Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
 (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Desporto)

Tabela 3: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
19	Grupo B	-	-	21	12	33	52
-	Grupo C	-	-	3	-	3	3
19	Total	-	-	24	12	36	55

Tabela 4: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
181	Garantir a implementação e interligação 2 sistemas: Nascer Utente/Notícia Nascimento; Programa e-vacinas	N.º	2	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
257	Assegurar a aquisição de 30% equipamentos informáticos	%	30	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
1.36.1	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver	N.º	1	1.ºT 2022	C	NC	1.ºT 2025	●
187	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver	N.º	1	1.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
210	Uniformização dos artigos referente à implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	1.ºT 2022	B	NC	2.ºT 2023	●
227	Lançamento do procedimento concursal no âmbito da integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório/áreas produtoras de imagem)	-	-	1.ºT 2022	B	NC	3.ºT 2023	●

247	Lançamento do procedimento concursal no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	-	-	1.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
195	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de consolidação financeira do SRS, do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	2.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
204	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de gestão de recursos humanos	-	-	2.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
211	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	2.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
196	Levantamento dos requisitos para integração no Portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação	-	-	3.ºT 2022	B	NC	2.ºT 2024	●
212	Desenvolvimento e testes para implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	3.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
1.37.1	Introdução de consultas de telemedicina no Serviço Regional de Saúde dos Açores	N.º	100	3.ºT 2022	C	NC	1.ºT 2024	●
240	Lançamento do procedimento concursal para Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários	-	-	3.ºT 2022	B	NC	2.ºT 2023	●
197	Entrada em produção do sistema de consolidação financeira do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	4.ºT 2022	B	NC	3.ºT 2024	●
220	Entrada em produção do sistema de evacuações e emergências do SRS.	-	-	4.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
248	Desenvolvimento e testes no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	-	-	4.ºT 2022	B	NC	3.ºT 2024	●
255	Assegurar a aquisição de 75% equipamentos hospitalares	%	75	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
258	Assegurar a aquisição de 60% equipamentos informáticos	%	60	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●

1.36.3	Lançamento de procedimento de contratação pública para desenvolvimento do Portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação	-	-	1.ºT 2023	C	NC	4.ºT 2024	●
205	Entrada em produção de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.	-	-	1.ºT 2023	B	NC	1.ºT 2025	●
216	Implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS	N.º	1	1.ºT 2023	B	NC	2.ºT 2024	●
241	Desenvolvimento e testes para Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários	-	-	1.ºT 2023	B	NC	2.ºT 2024	●
249	Entrada em produção de um sistema no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	1	1.ºT 2023	B	NC	4.ºT 2024	●
250	Entrada em produção de dois sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	2	2.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
183	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal dos utentes	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	3.ºT 2024	●
188	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal do Profissional de Saúde	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
206	Formação e Projeto-piloto do sistema de Informação Integrado de Gestão de RH dos Hospitais EPER			3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
224	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde	N.º	500	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
228	Desenvolvimento e testes no âmbito da integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica / laboratório/áreas produtoras de imagem)			3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
251	Entrada em produção de três sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	3	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
199	Entrada em produção do Portal	-	-	4.ºT 2023	B	A	1.ºT 2026	●

207	Entrada em produção.	-	-	4.ºT 2023	B	A	1.ºT 2026	●
229	Entrada em produção da integração de anatomia patológica	-	-	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
242	Entrada em produção por módulos	-	-	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
256	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades	%	100	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

- A execução encontra-se avaliada como “Condicionada” em 69,4% dos marcos e metas, quando no anterior trimestre a avaliação “Condicionada” se cifrava em 62,5%.
- A justificação dada pelo Beneficiário Final, a Secretaria Regional da Saúde e Desporto, continua a centrar-se na dificuldade na obtenção de matérias-primas e bens no mercado mundial, relacionadas com os processos de digitalização, assim como com as especificidades e complexidade de alguns dos sistemas a implementar.

● Crítica

- A execução encontra-se avaliada como “Crítica” em 19,4% dos marcos e metas, quando no anterior trimestre a avaliação “Crítica” se cifrava em 17,50%.
- A maioria da avaliação “Crítica” continua a ser justificada pela ausência de evidências facultadas pelo BF (Secretaria Regional da Saúde e Desporto) que demonstrem que os marcos e metas venham a ser cumpridos nos prazos previstos.

Investimento C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional)

Tabela 5: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	2	2	4
-	Grupo B	-	-	2	0	2	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2	Total	-	-	2	2	4	6

Tabela 6: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
358	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - construção de edifícios	N.º	36	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2025	●
359	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	N.º	132	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
360	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – construção de edifícios	N.º	70	4.ºT 2023	A	A	4.ºT 2025	●
361	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – renovação	N.º	318	4.ºT 2023	A	A	4.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Os constrangimentos externos, nomeadamente no que concerne à disponibilidade de mão-de-obra e matérias-primas, principalmente as relacionadas com a eficiência energética, continuam a condicionar gravemente a execução deste investimento, quer ao nível de preços, quer ao nível de prazos, dificultando o cumprimento dos marcos e metas.

No âmbito do processo de reprogramação do PRR, dirigido para as correções necessárias decorrentes desta situação em particular, o Beneficiário Final apresentou uma proposta atualizada das Metas, que se encontra em análise pela Comissão Europeia.

Relativamente à construção de edifícios, estão a decorrer 21 procedimentos, dos quais 4 relativos a projetos de infraestruturas, 2 a concursos para execução de infraestruturas, 12 à elaboração/revisão de projetos e 3 a empreitadas de construção de moradias. Não se prevê,

este ano, a conclusão de qualquer construção, estando a decorrer procedimentos com vista ao início das empreitadas, maioritariamente no 2º semestre de 2023, com conclusão prevista para 2024 e 2025 (48 imóveis). Até final de maio, decorrem os concursos para construção das 10 moradias que se prevê concluir em 2024. Os restantes concursos serão lançados ao longo do ano de 2023, devendo a conclusão das obras ocorrer no decorrer do ano de 2025.

Quanto à renovação de edifícios, estão em curso 15 procedimentos, 10 dos quais se referem à elaboração de projetos e 5 a empreitadas. Foram lançados concursos para reabilitação de 9 fogos na ilha do Pico, 37 na ilha Terceira e 5 imóveis na ilha Graciosa. Foi contratada a empreitada de reabilitação de uma moradia no concelho de Vila Franca do Campo, bem como a de renovação de outras 9 no concelho da Povoação.

Perante este cenário, a avaliação é “Condicionada”.

Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional)

Tabela 7: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
2	Grupo B	-	1	3	2	6	8
-	Grupo C	-	1	-	-	1	1
2	Total	-	2	3	2	7	9

Tabela 8: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
443	Viaturas adquiridas	N.º	26	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
441	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	20	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
444	Viaturas adquiridas	N.º	46	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
442	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	80	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
438	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas	N.º	312	4.ºT 2023	B	DP	-	●
445	Viaturas adquiridas	N.º	66	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
3.16.1	Relatório sobre os progressos alcançados na consecução da meta 3.16, apresentando informações sobre: i) o número de crianças abrangidas pela isenção de pagamento de mensalidades de infantários; ii) o número de crianças e jovens apoiados através da criação de pontos de apoio ao estudo; iii) o número de estudantes do ensino superior apoiados; o número de novas vagas para crianças em creches e na rede de amas.	-	-	4.ºT 2023	C	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Informações complementares:

443, 444 e 445:

- O número de viaturas aprovadas nas candidaturas apresentadas no âmbito do Programa “Gerações em Movimento” já ultrapassa a meta estabelecida para o final de 2023:
 - Em Edições anteriores aos avisos foram aprovadas 10 viaturas;
 - Na 1ª Fase ([Aviso n.º2/C03-i04/2022](#), publicado a 06/01/2022, com uma dotação global de 1,5 M€), foram aprovadas 41 viaturas;
 - Na 2ª Fase ([Aviso n.º 4/C03-i04/2022](#), publicado a 30/06/2022, com uma dotação global de 1,2 M€), foram aprovadas 30 viaturas.
- Continuam a verificar-se constrangimentos externos, nomeadamente no que respeita ao prazo de entrega destas viaturas por parte dos fornecedores, por vezes superior a 1 ano, dada a escassez no mercado de alguns componentes necessários à produção, aliada à elevada e crescente procura de viaturas elétricas por toda a Europa, tendo, até ao momento, sido entregues apenas 11 viaturas. No entanto, são fortes as evidências que, no final da execução do PRR, o objetivo será cumprido, pelo que a avaliação é favorável.

● Condicionada

441:

- Antecipam-se constrangimentos no que respeita à construção/remodelação de novos equipamentos dada a conhecida escassez de mão-de-obra, materiais de construção e consequente subida de preços e aumento dos custos, agravado pela condição arquipelágica da Região, podendo também verificar-se algum atraso nos processos de contratação pública. Face à programação temporal das obras em questão, apenas existem condições para disponibilização de novas vagas no decorrer do 2º semestre de 2024, havendo, ainda assim, grande risco deste prazo derrapar, dependendo, sobretudo do tempo necessário para se efetivar o processo de contratação pública. No entanto, o projeto técnico da Construção de um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e de um Lar Residencial, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Lagoa, foi aprovado e prevê-se lançamento do concurso de empreita no 2T de 2023.

O projeto de construção de Centro de Dia especializado e ATL nas Lajes das Flores está em fase de licenciamento, tendo o pedido de licenciamento sido entregue na respetiva Câmara Municipal. No processo relativo à adaptação de imóvel para Lar residencial em Santa Maria foi adquirido o imóvel em 2021 e decorrem os procedimentos de contratação pública para a elaboração do respetivo projeto. As restantes obras previstas mantêm a sua calendarização, estando em fase de estudo prévio.

Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 9: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	-	-	2
1	Grupo B	-	-	-	-	-	1
1	Grupo C	-	-	1	1	2	3
4	Total	-	-	1	1	2	6

Tabela 10: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
5.17.2	Desenvolvimento e adoção, por parte do gestor do veículo, de pelo menos dois programas de investimento no total. Os programas de invest. devem ser desenvolvidos e adotados pelo BPF, organismo de gestão do veículo, e, no quadro estabelecido pela política de investimento, devem descrever a finalidade e a dimensão indicativa do programa, enumerar os instrumentos financeiros que podem aplicar, pormenorizar os critérios de seleção / elegibilidade para as empresas apoiadas e especificar os objetivos de investimento e retornos visados	-	-	1.ºT 2022	C	NC	2.ºT 2023	●
5.17.4	Apresentação de um relatório anual que comprove a entrega de um total de 50 000 000 EUR às empresas não financeiras da região em apoio de capital e quase capital, em conformidade com a política de investimento do instrumento, incluindo informações sobre: investimentos efetuados para cada tipo de programa de investimento, taxas de rentabilidade esperadas, custos administrativos suportados, eventuais	-	-	4.ºT 2023	C	A	2.ºT 2024	●

alienações, reembolsos e
conversões em
subvenções.

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

5.17.2:

- Encontra-se parcialmente cumprido, com a implementação em curso do primeiro instrumento, estando a decorrer o processo de preparação de um segundo instrumento. Aguarda-se a finalização do Aviso do novo instrumento, a ser publicado, pelo Banco Português de Fomento, no final do mês de maio, com verbas do FCEA, para promover a recapitalização de PME nos Açores, através de empréstimos participativos ou instrumento similar, com o envolvimento de bancos comerciais.

5.17.4:

- O relatório será elaborado após a disponibilização dos instrumentos aprovados às empresas regionais. Na medida em que o instrumento de empréstimos participativos ficará operacionalizado em maio deste ano, com uma verba prevista de 20 milhões de euros, e que o segundo instrumento será lançado subsequentemente, só será possível a execução da verba cumulativa de 50 milhões de euros para ambos os instrumentos no primeiro semestre do próximo ano.

Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural)

Tabela 11: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	-	-	1
1	Grupo B	-	1	-	-	1	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2	Total	-	1	-	-	1	3

Tabela 12: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
599	Ilhas com sistema de avisos agrícolas	N.º	2	4.ºT 2023	B	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Informação complementar:

599:

- Encontra-se a decorrer o prazo para apresentação de propostas ao concurso público, com publicidade internacional para o desenvolvimento de uma rede de monitorização e avisos agrícolas ao nível de ilha. Prevê-se a celebração do contrato e o início da sua execução durante o 2.º trimestre de 2023.
- De acordo com a calendarização dos trabalhos, a emissão de avisos agrícolas nas ilhas de São Miguel e Terceira iniciar-se-á no 3.º trimestre de 2023, dando cumprimento à meta estabelecida.

Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego)

Tabela 13: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
-	Grupo B	-	-	3	-	3	3
-	Grupo C	-	-	-	2	2	2
-	Total	-	-	3	2	5	5

Tabela 14: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
651	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	260	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
652	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	520	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
656	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	3	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
6.10.1	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	780	4.ºT 2023	C	A	(não definido)	●
6.11.1	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	7	4.ºT 2023	C	A	(não definido)	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

O ponto de situação deste investimento continua a revelar um atraso considerável, que poderá pôr em causa o alcance das Metas A contratualizadas. Tem vindo a ser encetadas um conjunto de iniciativas por parte do BI junto do BF (Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego), no sentido duma análise conjunta das dificuldades e formas de ultrapassar os constrangimentos atuais.

Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 15: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	1	-	-	1	2
1	Grupo B	1	-	-	-	1	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2	Total	1	1	-	-	2	4

Tabela 16: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
713	Último Projeto técnico rodoviário concluído (todos os projetos concluídos)	-	-	1.ºT 2023	B	C	-	●
714	Contrato assinado para 8 projetos rodoviários	-	-	2.ºT 2023	A	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada:

714:

- Estão assinados 3 contratos, Variante ao Portal do Vento, Variante às Furnas e Variante a S. Roque. Do ponto de vista da realização dos procedimentos conducentes à adjudicação das obras, até 30 de junho de 2023, há condições para assinar os contratos de Variante a Madalena, Variante a Horta 2ª fase, Ligação entre a E.R. nº 3-2ª e a E.R. nº 4-2ª, Variante a Vila do Porto e Transversal de S. Jorge. Não obstante, e considerando os atrasos nos procedimentos de expropriação, há um risco elevado de não se cumprir este marco.

Informações complementares:

713:

- 10 projetos de execução concluídos: (I) Variante a S. Roque; (II) Variante a Furnas/Povoação; (III) Variante ao Portal do Vento; (IV) Variante a Madalena; (V) Variante a Horta 2ª fase; (VI) Ligação entre a E.R. nº 3-2ª e a E.R. nº 4-2ª; (VII) Variante a Vila do Porto; (VIII) Transversal de S. Jorge; (IX) Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra e (X) Variante a Capelas.

Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"

(Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 17: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	1	-	1	1
1	Grupo B	-	-	-	-	-	1
2	Grupo C	-	1	-	1	2	4
3	Total	-	1	1	1	3	6

Tabela 18: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
10.8	Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC	-	-	4.ºT 2022	A	NC	4.ºT 2023	●
10.9.2	Início da Construção e armamento do navio de investigação	-	-	2.ºT 2023	C	DP	-	●
10.10.1	Pelo menos 50% da execução da Empreitada	-	-	4.ºT 2023	C	A	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Crítica

10.8 e 10.10.1:

- Está em curso uma reprogramação do investimento, visando o redimensionamento do projeto inicial, preservando os objetivos do investimento e reduzindo a ambição ao nível de área e de projeção, mantendo o Centro de Aquicultura e o Parque Marinho dos Açores, com a criação de novos espaços para os previstos utilizadores de I&D nos edifícios a construir. Aguarda-se o culminar do processo de reprogramação do PRR, o qual poderá vir a contemplar uma outra solução, nomeadamente a possibilidade de manter o projeto inicial.
- O atraso verificado na execução do marco 940, impossibilita a concretização atempada do marco 941.

Informação complementar:

10.9.2:

- A assinatura do contrato do navio de investigação ocorreu no dia 6 de abril de 2023. O contrato de construção deverá ser visado pelo Tribunal de Contas no 3.º trimestre de 2023, iniciando-se, assim, o contrato de obras públicas relativo ao novo navio de investigação.

Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 19: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	1	1	1
6	Grupo B	-	1	-	2	3	9
-	Grupo C	-	-	2	1	3	3
6	Total	0	1	2	4	7	13

Tabela 20: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
14.11.2	Conclusão dos ensaios nos poços	-	-	4.ºT 2022	C	NC	4.ºT 2023	●
14.13.1	Novos sistemas de armazenamento de energia com baterias e sistemas de gestão de energia na RAA: início das obras nas ilhas do Faial, das Flores e do Corvo	-	-	4.ºT 2022	C	NC	4.ºT 2023	●
397	Produção adicional de eletricidade renovável no Corvo	kW	850	4.ºT 2023	A	A	2.ºT 2024	●
1059	Conclusão das obras do PF e PE	-	-	4.ºT 2023	B	A	2.ºT 2024	●
1063	Início das obras nas ilhas São Jorge e Pico	-	-	4.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
1067	Aumento da capacidade instalada em, pelo menos, 3,3 MW	MW	3.3	4.ºT 2023	B	DP	-	●
14.11.3	Contratação da instalação de novos grupos CGPV e CGPA	-	-	4.ºT 2023	C	A	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

14.11.2:

- Os ensaios de produção dos Poços CL8, PA5, PA6 e PA7 encontram-se em curso desde julho de 2022. Contudo, estes poços tendem a apresentar um comportamento distinto dos anteriores, pelo que os trabalhos inerentes aos ensaios de produção destes Poços estão a ser mais exigentes, atrasando o início da produção.

14.13.1:

- A 07/11/2022 terminou o prazo para a entrega de propostas relativo ao concurso público internacional para o "Contrato de conceção, construção, fornecimento, montagem, ensaios, entrada em serviço e garantia dos Sistemas de Armazenamento de Energia e Sistema de Gestão para as Ilhas Faial, Flores e Corvo". Foi decidida a não adjudicação das propostas apresentadas ao procedimento e, em 16/12/2022, foi autorizada abertura de novo procedimento concursal que foi publicitado a 11/01/2023. Prevê-se a conclusão do marco a 31/12/2023.

397 e 1059:

- O auto de consignação da empreitada de Fornecimento de Aerogeradores para o Parque Eólico do Corvo (marco 1058), ocorreu a 07/11/2022. Pese embora tenha sido adjudicado dentro do prazo estipulado, o contrato tem uma execução de 18 meses, pelo que a conclusão das obras do Parque Eólico, apenas ocorrerá no segundo trimestre de 2024, atendendo também à complexidade e dimensão da operação logística em causa, em virtude de se realizar na ilha do Corvo.

1063:

- Está em curso o estudo de dimensionamento e viabilidade técnica dos Sistemas de Armazenamento de Energia para a ilha do Pico, prevendo-se a sua conclusão em junho de 2023;
- Estima-se que o lançamento do concurso público internacional para a instalação dos Sistemas de Armazenamento de Energia para as ilhas de São Jorge e Pico ocorra durante o 4.º trimestre de 2023.

14.11.3:

- A conclusão das especificações técnicas do Cadernos de Encargos que suportará a contratação do novo grupo da CGPA, necessita da caracterização da energia primária disponível nos poços geotérmicos que serão avaliados até ao final de 2023 (marco 14.11.2);
- Deste modo, prevê-se a contratualização da aquisição dos equipamentos da CGPV no 4º trimestre de 2023 e da CGPA no 3º trimestre de 2024.

Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 21: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
14	Grupo B	1	5	1	2	9	23
-	Grupo C	-	1	-	-	1	1
14	Total	1	6	1	3	10	24

Tabela 22: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1433	Aprovação do caderno de especificação de requisitos para o desenvolvimento do Novo Portal de Serviços da APR (frontoffice e backoffice)	N.º	1	1.ºT 2023	B	NC	3.ºT 2023	●
1438	Consulta preliminar ao mercado para identificação de soluções e opções tecnológicas	N.º	1	1.ºT 2023	B	C	-	●
1422	Lançamento de projeto-piloto com posto móvel de atendimento ao cidadão	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	3.ºT 2024	●
1428	Aprovação do caderno de especificação de requisitos funcionais e técnicos para implementar o roll-out da plataforma de interoperabilidade eHUB-RAA baseada em FLOSS	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●
1434	Entrega do produto mínimo viável para o Simulador de serviços transacionais e online com 3 serviços disponíveis	N.º	3	3.ºT 2023	B	DP	-	●
1439	Lançamento de procedimento de contratação pública para o fornecimento da plataforma tecnológica	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●
1447	Fornecimento e instalação de plataforma SIEM (Information and Event Management) e solução de análise de tráfego para suportar o Centro de Operações de Cibersegurança (SOC) - Azores_Ciber360	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●

1453	Entrada em produção do Sistema Integrado de Gestão da Formação da Administração Pública Regional	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
1458	Formação de, até 100, trabalhadores da Administração Pública Regional em metodologias de desenho de serviços públicos	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●
19.18.1	Relatório sobre a execução dos projetos: - APR+ Acessível, Inclusiva e Aberta - APR+ Serviços mais ágeis - APR+ Proativa - Portal móvel para a administração pública regional - APR+ Apta para o futuro	-	-	4.ºT 2023	C	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

- Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

1433:

- A Direção Regional das Comunicações e da Transição Digital está a reunir elementos e especificidades técnicas para avaliar soluções de mercado nesta área que cumpram os requisitos de integração com todo o ecossistema. No entanto, atenta a complexidade da solução e as suas especificações técnicas, conjugadas com o impacto da conjuntura atual, existe o risco de atraso no cumprimento desta meta.

1453:

- O atraso verificado entre a decisão de adjudicação e a celebração do contrato condicionou o cumprimento da meta no prazo contratualizado, motivo pelo qual foi definido novo prazo de implementação. Não obstante prevê-se que no decurso do 3º trimestre de 2023 seja possível o "go live" do SIGEF com algumas funcionalidades

Informação complementar:

1422:

- No âmbito deste projeto da RIAC, serão adquiridos 11 postos de atendimento móveis (viaturas elétricas), sendo que até ao 3.ºT 2023 existirão 2 postos móveis de atendimento ao cidadão para prova de conceito. O projeto ficará concluído até final do 3.ºT 2024, com a disponibilização de uma APP para os cidadãos com os serviços da RIAC.

Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais)

Tabela 23: Resumo dos Marcos e Metas - RP 1.º T 2023

Completo até 4T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 1ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	-	-	1
3	Grupo B	-	3	-	-	3	6
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
5	Total	-	3	-	-	6	8

Tabela 24: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1542	Aquisição de equipamentos digitais móveis	N.º	18.000	4.ºT 2023	B	DP	-	●
1546	Ambientes educativos inovadores	N.º	220	4.ºT 2023	B	DP	-	●
1550	Conceção de MOOCs	N.º	8	4.ºT 2023	B	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

- Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Informações complementares:

1542:

- Foram adquiridos 14.916 equipamentos, nomeadamente:
 - 4.000 computadores e 1.000 tablets adquiridos em 2021
 - 3.028 computadores e 1.000 tablets adquiridos em 2022
 - 2.875 tablets e 3.013 Chromebooks Go adquiridos em 2022, no âmbito da aquisição dos manuais digitais
- Estão em elaboração as peças para o lançamento de novo procedimento concursal.

1550:

- Desenvolvidos e disponibilizados 7 cursos: 4 para professores e 3 para encarregados de educação.
- Estão em desenvolvimento 5 cursos. No fim do corrente ano estarão disponíveis 12 cursos: 6 para professores e 6 para encarregados de educação, ultrapassando-se a meta prevista inicialmente.

(esta página foi deixada em branco)



GOVERNO
DOS AÇORES



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU
