



PRR-AÇORES

4º
RELATÓRIO
PERIÓDICO DE
MONITORIZAÇÃO
TRIMESTRE
2024

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
13 de fevereiro de 2025



GOVERNO
DOS AÇORES



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

FICHA TÉCNICA

Título

Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores – 4º Trimestre de 2024

Editor

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Endereço

Caminho do Meio, 58 – São Carlos

9701-853 Angra do Heroísmo

Tel.: +351 295 206 380

drepa@azores.gov.pt | prp.acores@azores.gov.pt

<https://portal.azores.gov.pt/web/drepe/prp>

Data de Edição

13 de fevereiro de 2025

ÍNDICE

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	5
RESUMO MARCOS & METAS.....	8
AValiação DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	9
Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)	9
Investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego).....	13
Investimento C02-i07-RAA – Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)	15
Investimento C02-i08-RAA – Reforço do parque habitacional social (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)	16
Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social).....	17
Investimento C03-i07-RAA – Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)	20
Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública).....	22
Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação)	25
Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)	28
Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)	31
Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)	32
Investimento C10-i05-RAA – Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor das pescas e da aquicultura (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas).....	33
Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	34
Investimento C16-i05-RAA – Capacitação Digital e Transformação das Empresas dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	37
Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	38

Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto).....	42
Investimento C21-i10-RAA – Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	44
Investimento C21-i15-RAA – Aquisição de 2 ferries elétricos (Beneficiário Final – Atlânticoline S.A.)	45

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS

A Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE), enquanto órgão de coordenação técnica e de monitorização, designado pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 23/2021/A, de 3 de setembro, tem como competência a elaboração e apresentação aos órgãos de coordenação política e de acompanhamento, de relatórios periódicos de monitorização e relatórios anuais de progresso, bem como responder às demais necessidades de informação desses órgãos.

Nestes termos, o cronograma estabelecido para a elaboração dos relatórios acima referidos é o seguinte:

- Relatórios Periódicos de Monitorização (Trimestrais) – **elaboração até ao último dia do mês seguinte ao final de cada trimestre**, com base exclusivamente nos Relatórios de Progresso (RP) dos Beneficiários Finais (BF), elaborados por estes até ao dia 10 do mês seguinte ao final de cada trimestre e relativos ao ponto de situação dos Marcos e Metas desse trimestre e dos quatro trimestres seguintes;
- Relatórios Anuais de Progresso – **elaboração até ao final de fevereiro do ano seguinte** àquele que dizem respeito, relativos a aspetos globais da gestão e da execução do PRR-Açores, incluindo, entre outras, questões relativas a ações de acompanhamento e auditoria; combate à corrupção, fraude, duplo financiamento e segregação de funções; ao princípio de não prejudicar significativamente o ambiente (DNSH) e estratégia de comunicação.

Em outubro de 2023, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia, respetivamente, avaliaram positivamente a reprogramação do PRR e adotaram uma nova [Decisão de Execução do Conselho \(CID\)](#), a qual inclui alterações em 18 Metas do Grupo A nos investimentos iniciais do PRR-Açores e alterações financeiras em 5 deles, resultando num reforço da ambição inicial, para além da aprovação de 7 novos investimentos, atualizada e disponível em [Documentação - Documentação Europeia - Decisões do Conselho Europeu - PRR - Recuperar Portugal](#).

Este 13º Relatório Periódico de Monitorização, à semelhança dos anteriores, tem por base a informação inserida no Sistema de Informação do PRR (SI PRR) pelos BF, no início do mês de janeiro, relativa ao quarto Relatório de Progresso Trimestral de 2024, referente aos dezoito investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência para os Açores, treze dos quais com marcos e metas no período objeto deste Relatório.

O período de reporte é o 4.º Trimestre de 2024, com uma análise que incide também sobre os Marcos e Metas dos Grupos A, B e C considerados “Não Completos” nos trimestres anteriores, e uma análise sobre os Marcos e Metas dos Grupos A, B e C a cumprir nos quatro trimestres seguintes (até ao 4.º Trimestre de 2025).

Com base nas evidências dos indicadores dos Marcos e Metas a atingir apresentadas pelos BF, que incluem o prazo contratualizado e os mecanismos de verificação constantes na mais recente versão do [Acordo Operacional](#), o estado dos Marcos e Metas é classificado como “Completo” ou “Não Completo”, no que concerne aos Marcos e Metas do trimestre objeto do Relatório de Progresso e dos trimestres anteriores, e classificado como “Dentro do Prazo” ou “Atrasado” para os Marcos e Metas dos quatro trimestres seguintes.

Independentemente do estado dos Marcos e Metas, o Beneficiário Intermediário estabelece uma avaliação sobre a informação/evidências/dificuldades apresentadas pelos BF, que reflete se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, e que se traduz numa avaliação Favorável (●), Condicionada (●) ou Crítica (●).

Os Marcos e Metas do Grupo A, denominadas de “desembolso”, são aqueles cujo cumprimento viabiliza os pedidos de pagamento por parte da Comissão Europeia ao Estado Membro, e como tal, o seu cumprimento deverá ser rigoroso, não só na sua dimensão quantitativa, mas também qualitativa e temporal, cumprindo plenamente os objetivos que pretendiam alcançar e os requisitos contratuais e ambientais.

Os Marcos e Metas do Grupo B, funcionam como indicadores de monitorização do estado de execução dos investimentos, cujo cumprimento permite garantir o alcance dos Marcos e Metas do Grupo A, servindo de alerta na eventualidade de não serem cumpridos no calendário previamente definido.

Os Marcos e Metas do Grupo C, que constam do anexo II do anterior [Acordo Operacional](#), foram definidos pela Comissão Europeia, e funcionam como indicadores de monitorização associados a algumas metas do Grupo A, cuja monitorização será acompanhada, adicionalmente, nos prazos estabelecidos e, em alguns casos, são coincidentes com Marcos e Metas do Grupo B.

No âmbito deste relatório é ainda apresentada informação complementar/ponto de situação relativamente aos investimentos que só apresentam Marcos e Metas a cumprir após o 4º Trimestre de 2025.

A análise neste Relatório Periódico de Monitorização incidiu sobre o nível de execução de 95 Marcos e Metas, deste trimestre e dos quatro trimestres seguintes, incluindo os não completos em trimestres anteriores, com a distribuição temporal expressa na Tabela 1.

Tabela 1: Número de Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Metas	2021		2022		2023				2024				2025			Total
	4T		2T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	3T	4T	
Grupo A	-		-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	22	24
Grupo B	1		1	3	2	1	2	5	3	-	10	12	7	6	10	63
Grupo C	-		-	1	-	-	-	4	1	1	-	1	-	-	-	8
Total	1		1	4	2	1	2	9	5	1	10	13	7	7	32	95

Neste Relatório Periódico de Monitorização procede-se também a uma análise relacionada com os Marcos e Metas anteriormente completos, conforme consta na Tabela 2 e subseqüentes relativas à análise individual dos investimentos.

Tabela 2: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024, com acumulado dos completos

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
12	Grupo A	2	17	1	4	24	36
104	Grupo B	15	13	30	5	63	167
12	Grupo C	1	-	7	-	8	20
128*	Total	18*	30	38*	9	95	223

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (128+18+38=184)

Assim, constata-se que já foram cumpridos 79% dos 184 Marcos e Metas dos Grupos A, B e C até ao 4.ºT de 2024, o que representa, globalmente, um bom nível de execução dos investimentos do PRR-Açores.

Na tabela seguinte procede-se à análise na perspetiva de cada um dos investimentos:

Tabela 3: Marcos e Metas a cumprir até ao 4.ºT 2024

Investimento	Completo	Não Completo	Total	%
C01-i08-RAA	55	16	71	77%
C02-i04-RAA	3	-	3	100%
C03-i04-RAA	11	3	14	79%
C05-i04-RAA	5	3	8	63%
C05-i05-RAA	5	-	5	100%
C06-i05-RAA	3	4	7	43%
C07-i05-RAA	5	-	5	100%
C10-i04-RAA	5	1	6	83%
C14-i03-RAA	11	6	17	65%
C19-i06-RAA	32	4	36	89%
C20-i02-RAA	11	-	11	100%
C21-i15-RAA	-	1	1	0%
Total	146	38	184	79%





A avaliação dos Marcos e Metas apresentada de seguida para cada investimento terá em conta o processo de reprogramação em curso submetido recentemente por Portugal à Comissão Europeia. Esta reprogramação pretende garantir a implementação eficiente das reformas e investimentos previstos, visando ajustar os marcos e as metas que se revelem parcial ou totalmente não exequíveis por força de circunstâncias objetivas e devidamente justificadas.

RESUMO MARCOS & METAS

Resumo 13º RP - 4ºT 2024

TOTAL
95

Marcos & Metas								
Investimento	2021	2022	2023	2024	2025		Não completo/Atrasado	Completo/Dentro do prazo
C01-i08-RAA	1	3	8	9	7		17	11
C02-i04-RAA	0	0	0	0	2		2	1
C02-i08-RAA	0	0	0	0	1		1	1
C03-i04-RAA	0	0	1	3	8		4	8
C05-i04-RAA	0	0	1	2	1		3	1
C05-i05-RAA	0	0	0	0	6		1	5
C06-i05-RAA	0	1	2	2	2		4	3
C10-i04-RAA	0	0	0	1	3		2	2
C14-i03-RAA	0	1	2	3	3		6	3
C19-i06-RAA	0	0	0	5	8		6	7
C20-i02-RAA	0	0	0	3	3		6	6
C21-i10-RAA	0	0	0	0	1		1	1
C21-i15-RAA	0	0	0	1	1		2	1
Total Geral	1	5	14	29	46		47	48

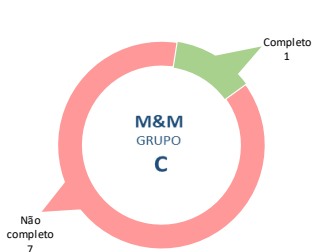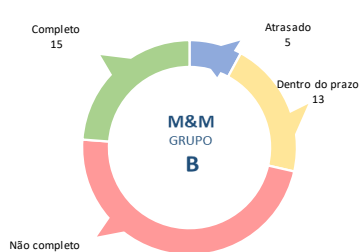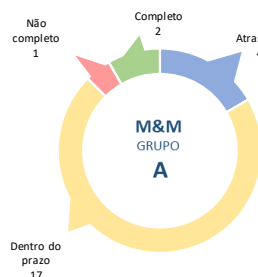

Completo	Dentro do prazo	Atrasado	Não completo		
5	6	1	16		C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
0	0	2	0		C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da RAA
0	1	0	0		C02-i08-RAA - Reforço do parque habitacional social
4	4	1	3		C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social
0	1	0	3		C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores
2	3	1	0		C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana
1	2	0	4		C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA
0	2	1	1		C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"
1	2	0	6		C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores
2	5	2	4		C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA
3	3	0	0		C20-i02-RAA - Educação digital (Açores)
0	1	0	0		C21-i10-RAA - Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores
0	0	1	1		C21-i15-RAA - Aquisição de 2 ferries elétricos

AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS

Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
 (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 4: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	1	-	-	1	2
46	Grupo B	5	5	15	1	26	72
3	Grupo C	-	-	1	-	1	4
50*	Total	5*	6	16*	1	28	78

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (50+5+16=71)

Tabela 5: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
181	Garantir a implementação e interligação 2 sistemas: Nascer Utente/Notícia Nascimento; Programa e-vacinas	N.º	2	4.ºT 2021	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
211	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	2.ºT 2022	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
197	Entrada em produção do sistema de consolidação financeira do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	NC	2.ºT 2025	●
220	Entrada em produção do sistema de evacuações e emergências do SRS.	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	C	-	●
216	Implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS	N.º	1	1.ºT 2023	B	Meta	C	-	●
249	Entrada em produção de um sistema no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	1	1.ºT 2023	B	Marco	C	-	●
250	Entrada em produção de dois sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	2	2.ºT 2023	B	Marco	C	-	●
188	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal do Profissional de Saúde	N.º	1	3.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●

251	Entrada em produção de três sistemas	N.º	3	3.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
229	Entrada em produção da integração de anatomia patológica	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
256	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades	%	100	4.ºT 2023	B	Meta	C	-	●
230	Entrada em produção da integração de laboratórios	-	-	1.ºT 2024	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
244	Garantir a interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	5	1.ºT 2024	B	Meta	NC	3.ºT 2025	●
1.36.2	Entrada em produção da solução tecnológica que suporta o portal de acesso digital ao processo clínico	N.º	1	1.ºT 2024	C	Marco	NC	1.ºT 2025	●
185	Validação e atribuição de acessos ao portal do utente	N.º	15000	3.ºT 2024	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
190	Validação e atribuição de acessos aos profissionais de saúde	N.º	1000	3.ºT 2024	B	Marco	NC	3.ºT 2025	●
225	Garantir a integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/ laboratório / áreas produtoras de imagem)	N.º	3	3.ºT 2024	B	Meta	NC	1.ºT 2025	●
252	Entrada em produção dos cinco sistemas	N.º	5	3.ºT 2024	B	Marco	NC	3.ºT 2025	●
243	Entrada em produção na íntegra	-	-	4.ºT 2024	B	Marco	NC	4.ºT 2025	●
208	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	N.º	1	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
215	Entrada em produção.	-	-	1.ºT 2025	B	Marco	A	2.ºT 2025	●
232	Desmaterialização de valências de MCDT's	N.º	10	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
237	Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários.	N.º	1	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
186	Acesso ao portal do Profissional de Saúde	N.º	2500	3.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
1.36	Maior acesso ao portal dos utentes do Serviço Regional de Saúde dos Açores	N.º	25000	3.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
191	Implementação de um portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação	N.º	1	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
199	Entrada em produção do Portal	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
200	Projeto-piloto de integração dos KPI de 1 hospital no Portal	-	-	4.ºT 2024	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; **NC:** Não Completo; **DP:** Dentro do Prazo; **A:** Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 77% dos 71 Marcos e Metas até ao 4º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A, 51 do Grupo B e 3 do Grupo C, não estando completos 15 do Grupo B e 1 do Grupo C.

Informação complementar:

Meta Principal		Metas Associadas		Ponto de Situação
Número	Grupo	Número	Grupo	
1.36	A	181	B	Prevê-se a atribuição de acessos a 15.000 utentes no decorrer do 1T de 2025. O projeto Vacinas encontra-se implementado, decorrendo agora a recuperação de histórico dos utentes. Relativamente ao projeto Nascer Utente/Notícia Nascimento, o beneficiário continua a aguardar feedback por parte da SPMS e ACSS.
		183	B	
		185	B	
		1.36.1	C	
		1.36.2	C	
		1.36.3	C	
1.37	A	222	B	Dados relativos às teleconsultas publicados pelo SREA.
		224	B	
		1.37.1	C	
186	B	187	B	O portal do profissional de saúde enquadra-se no âmbito do projeto MUSA, que já se encontra em fase de desenvolvimento. No entanto, foi dada prioridade ao Portal do Utente, atrasando o desenvolvimento deste Portal. Não obstante, é expectável que o atraso seja recuperado.
		188	B	
		190	B	
191	B	192	B	Assinado o contrato de aquisição de serviços para desenvolvimento do portal, sendo que o portal se encontra em desenvolvimento, cuja conclusão se prevê em fevereiro de 2025. Relativamente aos sistemas de consolidação financeira, gestão de equipamentos e gestão de qualidade, o primeiro encontra-se em produção, o segundo, contratado a 08/10/2024, encontra-se numa fase inicial de localização de ativos que servirá de base ao levantamento de requisitos a iniciar em fevereiro de 2025 e, por fim, o terceiro que se encontra implementado no Hospital da Horta, estando pendente a implementação no Hospital do Divino Espírito Santo devido a constrangimentos associados ao incêndio ocorrido em 2024 e posterior instalação do Hospital Modular.
		193	B	
		194	B	
		195	B	
		196	B	
		197	B	
		199	B	
201	B	202	B	A diversidade e falta de procedimentos padronizados foram vistas como barreiras significativas à implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos, não sendo, por isso, desenvolvido este sistema. Em vez disso, e tendo em conta as necessidades identificadas, foram adquiridos módulos de formação para os Hospitais da Horta e de Santo Espírito da Ilha Terceira.
		203	B	
		204	B	
		205	B	
		206	B	
		207	B	
208	B	209	B	No âmbito desta meta não será criado, como previsto inicialmente, um sistema integrado de Gestão de Stocks dos Hospitais, tendo-se optado pelo desenvolvimento do projeto HDES: Mobile Health com projeto piloto implementado em 6 serviços.
		210	B	
		211	B	
		212	B	
		213	B	
		214	B	
216	B	215	B	Implementada a Solução Informática para Utilização da Unidade de Evacuações Aeromédicas dos Açores (UEA)
		217	B	
		218	B	
		219	B	
		220	B	

225	B	226	B	O projeto de Digitalização dos Serviços de Anatomia Patológica do HDES e do HSEIT encontra-se na fase 4 – configuração e interoperabilidade. No que concerne à entrada em produção da integração dos laboratórios, estão todos concluídos à exceção do HDES, que se prevê em março de 2025. A integração de áreas produtoras de imagens foi desenvolvida no âmbito da meta 232.
		227	B	
		228	B	
		229	B	
		230	B	
232	B	231	B	
		233	B	No âmbito do projeto bHealth foram implementadas as especialidades de Cardiologia e Pneumologia no HH e no HSEIT, bem como Neurologia, Urologia e Angiologia e Cirurgia Vascular no HSEIT.
		234	B	
		235	B	
		236	B	
237	B	238	B	Implementação do upgrade do sistema MedicineOne em curso. Em dezembro de 2024, foi apresentada a versão web que será implementada em qualidade no 1T de 2025.
		239	B	
		240	B	
		241	B	
		242	B	
		243	B	
244	B	245	B	Integrações dos sistemas RNU e MedicineOne concluídas, num total de 5.
		246	B	
		247	B	
		248	B	
		249	B	
		250	B	
		251	B	
253	B	252	B	
		254	B	Foram adquiridos 100% dos equipamentos hospitalares previstos.
256	B	255	B	
		257	B	Foram adquiridos 100% dos equipamentos informáticos previstos.
		258	B	

Investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 6: Resumo dos Marcos e Metas – RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
3	Grupo A	-	-	-	2	2	5
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
3*	Total	-	-	-	2	2	5

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (3)

Tabela 7: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
2.17	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - construção de edifícios	N.º	100	4.ºT 2025	A	Meta	A	2.ºT 2026	●
2.18	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – renovação	N.º	602	4.ºT 2025	A	Meta	A	2.ºT 2026	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Neste momento, já estão cumpridas todas as Metas do Grupo A cujo prazo inicial previa a sua concretização até ao 4.º trimestre de 2023.

As metas B ainda não foram ajustadas na sequência do processo de Reprogramação, e consequentemente não serão objeto de análise neste relatório, nomeadamente as metas B 362 e B 363. A meta B 362 tinha como objetivo a conclusão de 180 construções até 31/12/2024, completamente desadequada considerando que o total do investimento é inferior a esta meta (100 construções até 31/12/2025) e a meta B 363 tinha como objetivo a conclusão de 458 renovações até 31/dez/2024.

● Crítica

2.17:

- Ponto de situação a 31/12/2024 de habitações a construir:
 - Em fase de estudos e projetos – 37
 - Em fase de contratação – 3
 - Em fase de obra – 35
 - Concluídas - 25

2.18:

- Ponto de situação a 31/12/2024 de habitações a renovar:
 - Fase de estudos e projetos – 257
 - Em fase de contratação – 49
 - Em fase de obra – 85
 - Concluídas – 110

Como principais aspetos críticos e constrangimentos, identificam-se:

- O facto de 40 das 100 construções ainda não terem chegado à fase de adjudicação e respetiva contratualização, o que poderá ter implicações na calendarização, caso os concursos fiquem desertos;
- O facto de 407 das 602 renovações ainda não terem chegado à fase de adjudicação e respetiva contratualização, o que poderá ter implicações na calendarização, caso os concursos fiquem desertos;
- O aumento do preço de materiais e mão-de-obra pode colocar em causa o preço base dos procedimentos de contratação pública;
- A previsão de conclusão das construções é, na sua maioria, até ao final do 2.ºT de 2026, o que significa o incumprimento dos marcos e metas.

No âmbito do processo de revisão do PRR em curso, foi apresentada uma redução de ambição de 102 renovações (Meta 2.18).

Investimento C02-i07-RAA – Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 8: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	-	-	-	-	-

* este investimento só tem marcos e metas no 2.ºT 2026

Tabela 9: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

A Meta 2.30 (A) “Infraestruturas de parcelas de terreno”, tendo como objetivo a atribuição de 145 parcelas de terreno deverá ser implementada até ao 2.ºT de 2026.

O ponto de situação deste investimento sumariza-se como segue:

- 37 lotes atribuídos;
- 18 lotes prontos para atribuição;
- 16 lotes adquiridos infraestruturados em processo de revisão;
- 68 lotes adquiridos para infraestruturar, com previsão de início de obras no primeiro semestre de 2025;
- 14 lotes a adquirir em 2025.

Investimento C02-i08-RAA – Reforço do parque habitacional social (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 10: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	1	-	-	1	1
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	1	-	-	1	1

Tabela 11: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
2.31	Reforço do parque habitacional social da Região Autónoma dos Açores — habitações construídas	N.º	126	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada:

2.31:

No final do ano de 2024 o ponto de situação, resumido, deste investimento era o seguinte:

- Em fase de estudos e projetos – 12
- Em fase de contratação – 46
- Em fase de obra – 54

No âmbito do processo de revisão do PRR em curso, foi apresentada uma redução de ambição de 14 habitações.

Como principais aspetos críticos e constrangimentos, identificam-se:

- O facto de 72 das 126 construções ainda não terem chegado à fase de adjudicação e respetiva contratualização, o que poderá ter implicações na calendarização, caso os concursos fiquem desertos;
- O aumento do preço de materiais e mão-de-obra pode colocar em causa o preço base dos procedimentos de contratação pública.

Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 12: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	1	3	-	-	4	4
6	Grupo B	3	1	3	1	8	14
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
7*	Total	4*	4	3*	1	12	19

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (7+1+3=11)

Tabela 13: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
441	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	20	3.ºT 2024	B	Meta	NC	2.ºT 2026	●
442	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	80	3.ºT 2024	B	Meta	NC	2.ºT 2026	●
445	Viaturas adquiridas	N.º	66	4.ºT 2023	B	Meta	C	4.ºT 2024	●
446	Viaturas adquiridas	N.º	83	4.ºT 2024	B	Meta	NC	1.ºT 2025	●
429	Crianças abrangidas na isenção das mensalidades (até ao 10º escalão) em Creche assumidas pelas famílias	N.º	7750	4.ºT 2025	B	Meta	C	-	●
430	Crianças e jovens apoiados através da criação de pontos de apoio ao estudo	N.º	2320	4.ºT 2025	B	Meta	A	2.ºT 2026	●
431	Estudantes do ensino superior de famílias carenciadas apoiados	N.º	450	4.ºT 2025	B	Meta	C	-	●
432	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas	N.º	1041	4.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
3.12	Formação para membros de famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção	N.º	4000	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
3.14	Veículos adquiridos para as Instituições Particulares de Solidariedade Social	N.º	100	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●

3.15	Projeto «Ageing in place»	N.º	425	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
3.16	Medidas de combate ao abandono escolar precoce de crianças e jovens	N.º	11561	4.ºT 2025	A	Meta	C	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 73% dos 11 Marcos e Metas previstos até ao 4.º trimestre de 2024, sendo 7 do grupo B e 1 do grupo C. Não ficaram completos 3 Marcos e Metas do grupo B. Foram completas antecipadamente 1 Meta A (3.16) e 2 Metas B (429 e 431).

Informação complementar:

Meta 3.12:

- À data de reporte foram abrangidos 1.453 indivíduos, num total de 152 ações de formação. Esta meta foi incluída no processo de reprogramação em curso, reduzindo-se a ambição do número de formandos em 1.500, atendendo à diminuição sistemática registada do número de beneficiários do RSI, de 9.018 em 2020 para 4.437 em 2024.

Meta 430:

- À data de reporte foram apoiadas 598 crianças, considerando-se o cumprimento desta meta atrasado face ao objetivo contratualizado sem, no entanto comprometer o objetivo previsto para a meta A 3.16.

Metas 445 e 446:

- No âmbito do Programa “Gerações em Movimento”:
 - Foram entregues 8 viaturas em edições anteriores aos avisos;
 - Na 1.ª Fase ([Aviso 02/C03-i04-RAA/2022](#), publicado a 06/01/2022, com uma dotação global de 1 500 000 €), foram aprovadas 41 viaturas, sendo que 36 já foram entregues às instituições e 5 foram adjudicadas ao fornecedor, estando a aguardar entrega;
 - Na 2.ª Fase ([Aviso 04/C03-i04-RAA/2022](#), publicado a 30/06/2022, com uma dotação global de 1 200 000 €), foram aprovadas 30 viaturas, das quais 19 foram entregues às instituições e 11 foram adjudicadas ao fornecedor e aguardam entrega;
 - Na 3.ª Fase ([Aviso 15/C03-i04-RAA/2023](#), publicado a 26/06/2023, com uma dotação global de 975 000 €), foram aprovadas 24 viaturas, já contratualizadas com as IPSS. Destas, 11 foram entregues às instituições e 13 foram adjudicadas ao fornecedor.
- Assim, à data de 31/12/2024, foram entregues 74 viaturas às IPSS e outras 29 encontram-se adjudicadas ao fornecedor, pelo que o objetivo não foi atingido para a data de referência (M 446).

● Crítica

441 e 442:

- O ponto de situação das várias obras é o seguinte:
 - Os trabalhos da obra de construção do Lar Residencial e CAO da Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa tiveram início a 05/02/2024, estando a execução ligeiramente abaixo do previsto.
 - O concurso público para a empreitada de construção do CACI da Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico, lançado a 24/09/2024, ficou deserto. O lançamento de novo concurso aliado ao prazo de execução da obra resultaria na ultrapassagem do prazo de execução do PRR, comprometendo assim o cumprimento do objetivo contratualizado.
 - O contrato da empreitada da obra de ampliação e remodelação do Lar Residencial Kavivo da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia foi assinado a 13/11/2024. Aguarda-se a assinatura da respetiva consignação. A conclusão da obra está prevista para junho/2026;
 - A empreitada da obra de adaptação de imóvel a Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, lançada a 19/12/2023, caducou a sua adjudicação, tendo sido lançado novo procedimento. O prazo para apresentação de propostas terminou a 16/01/2025, tendo sido rececionada uma proposta;
 - O projeto de execução da obra de CACI e Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia da Horta encontra-se em fase de desenvolvimento. Tendo em conta que o concurso ainda não foi lançado, aliado ao prazo de execução previsto da obra, a execução da mesma ultrapassaria o prazo de execução do PRR, comprometendo assim o cumprimento do objetivo contratualizado;
 - O contrato da empreitada de construção de CATL inclusivo e Centro de Dia especializado nas Lajes das Flores foi assinado a 11/10/2024, tendo os trabalhos iniciado a 16/12/2024.
- Prevê-se, por conseguinte, a disponibilização de novas vagas para pessoas com deficiência no decorrer do 2.º semestre de 2026, havendo, no entanto, a possibilidade deste prazo não ser cumprido, em particular, nos casos em que o processo de contratação pública não se encontra efetivado. Na revisão do PRR em curso foi incluída a redução da meta de 207 para 124 vagas, associadas aos CACI da SCM Madalena e SCM Horta.

Investimento C03-i07-RAA – Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 14: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	-	-	-	-	-

* este investimento só tem marcos e metas no 1.ºT 2026

Tabela 15: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

O investimento C03-i07-RAA visa a criação ou reabilitação de vagas em estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI).

Este investimento materializa-se na concretização de 5 empreitadas, cujo ponto de situação se encontra abaixo descrito:

- Ampliação do Centro de apoio ao idoso da Madalena (30 vagas): o contrato de empreitada foi assinado a 26/11/2024, estima-se para breve o início dos trabalhos;
- Ampliação de ERPI e Criação de Centro de Dia em São Roque do Pico - Santa Casa da Misericórdia de São Roque do Pico (27 vagas): o concurso lançado a 14/06/2024 ficou deserto, devido ao respetivo preço base. Foi realizada nova estimativa e lançado novo concurso público a 11/10/2024 que, neste momento, se encontra em fase de apresentação de habilitação e caução;
- Reconstrução e ampliação de ERPI da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Graciosa (17 vagas): a empreitada decorre desde novembro de 2023, prazo de execução inicial foi de 10 meses, mas o mesmo foi prorrogado até dezembro de 2024;
- Remodelação do antigo edifício do Centro de Saúde de Santa Cruz da Graciosa para ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa (14 vagas): contrato de empreitada foi assinado a 20/12/2024 e adenda a 30/12/2024, estima-se início dos trabalhos durante o mês de fevereiro;
- Reabilitação da ERPI da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste (4 vagas): em preparação das peças de procedimento para lançamento do concurso público de empreitada (RCG nº 3/2025, de 10 de janeiro aprova o contrato CC-VI com a Santa Casa da Misericórdia de Nordeste).

Como principais aspetos críticos e constrangimentos, identificam-se:

- O facto de 2 das 5 obras ainda não terem chegado à fase de adjudicação e respetiva contratualização, o que poderá ter implicações na calendarização, caso os concursos fiquem desertos;
- O aumento do preço de materiais e mão-de-obra pode colocar em causa o preço base dos procedimentos de contratação pública.

Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 16: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	1	-	-	1	3
1	Grupo B	-	-	1	-	1	2
2	Grupo C	-	-	2	-	2	4
5*	Total	-	1	3*	-	4	9

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (5+3=8)

Tabela 17: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
5.17.4	Apresentação de um relatório anual que comprove a entrega de um total de 50 000 000 EUR às empresas não financeiras da região em apoio de capital e quase capital, em conformidade com a política de investimento do instrumento, incluindo informações sobre: investimentos efetuados para cada tipo de programa de investimento, taxas de rentabilidade esperadas, custos administrativos suportados, eventuais alienações, reembolsos e conversões em subvenções.	-	50000000	4.ºT 2023	C	Meta	NC	2.ºT 2025	●
5.17.3	Desenvolvimento e adoção, por parte do gestor do veículo, de pelo menos quatro programas de investimento no total, cuja dimensão agregada indicativa abrange a totalidade da meta de apoio (125 000 000 EUR). Os programas de investimento devem ser desenvolvidos e adotados pelo BPF, organismo de gestão	-	-	2.ºT 2024	C	Marco	NC	4.ºT 2025	●

	do veículo, e, no quadro estabelecido pela política de investimento, devem descrever a finalidade e a dimensão indicativa do programa, enumerar os instrumentos financeiros que podem aplicar, pormenorizar concretamente os critérios de seleção/elegibilidade para as empresas apoiadas e especificar os objetivos de investimento e retornos visados.								
595	Entrega de um total de EUR 75 milhões ao tecido empresarial regional, em auxílio de Estado à capitalização. Indicativamente, estima-se que, até a 2024, sejam apoiadas pelo menos 150 empresas.	N.º	150	4.ºT 2024	B	Meta	NC	2.ºT 2025	●
5.17	Entrega de um total de 125 000 000 EUR às empresas não financeiras da região em apoio de capital e quase-capital, em conformidade com a política de investimento do instrumento. Indicativamente, estima-se que pelo menos 300 empresas sejam apoiadas até à conclusão do plano.	EUR.	125000000	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 63% dos 8 Marcos e Metas até ao 4º trimestre de 2024, sendo 2 do Grupo A, 1 do Grupo B e 2 do Grupo C, não estando completos 2 marcos do Grupo C e 1 meta do Grupo B.

● Crítica

5.17.4:

- A meta refere-se à elaboração de um relatório que comprove a entrega de 50 milhões de euros a empresas não financeiras da Região. Segundo informação reportada pelo beneficiário, existem 50 candidaturas ao CPA I, 8 das quais aprovadas, estando 20 contratadas e 8 em análise, sendo que se verificaram 14 desistências.

595:

- De acordo com o reporte efetuado pelo BF estima-se um atraso de dois trimestres para cumprimento da meta passando para o 2ºT/2025, considera-se assim que a sua execução é crítica, considerando a baixa adesão ao programa lançado com um valor de 20 milhões de euros.

5.17:

- No âmbito do processo de revisão do PRR está a ser analisada a possibilidade de utilizar parte das verbas que estavam destinadas a instrumentos de quase capital, como o Capital Participativo Açores, em instrumentos de capital, como o deal-by-deal ou capital de risco.

● Condicionada

5.17.3:

- Lançado Aviso de Candidaturas para o Instrumento Capital Participativo Açores I:
 - 4 intermediários financeiros protocolados;
 - 50 candidaturas submetidas de beneficiários finais:
 - 8 candidaturas em estado “aprovado”;
 - 20 em estado “contratado”;
 - 8 candidaturas em análise;
 - 14 candidaturas desistidas/desconsideradas.
- Lançado Aviso de Candidaturas para o Instrumento Capital Participativo Açores II:
 - 4 intermediários financeiros credenciados, aguardando-se a assinatura dos protocolos de cooperação entre os bancos comerciais e o BPF.
- Os restantes instrumentos e a respetiva tipologia serão analisados no início de 2025.

Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação)

Tabela 18: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	1	2	-	1	4	5
2	Grupo B	1	1	-	-	2	4
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
3*	Total	2	3	-	1	6	9

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4ºT de 2024 (3)

Tabela 19: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
5.19	Estruturas novas (para substituir estruturas obsoletas) ou requalificadas para o abate de animais e certificação da qualidade do leite e da segurança dos alimentos	N.º	3	4.ºT 2025	A	Meta	A	2.ºT 2026	●
5.20	Projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação de empresas do setor da transformação e comercialização	N.º	9	4.ºT 2025	A	Meta	C	3.ºT 2024	●
598	Ilhas com sistema de avisos agrícolas	N.º	5	4.ºT 2025	B	Meta	C	3.ºT 2024	●
5.21	Projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas	N.º	178	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
5.22	Explorações agrícolas que beneficiam de apoio técnico especializado ao abrigo do Programa de Capacitação dos Agricultores	N.º	2000	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
601	Iniciativas de promoção da literacia da população em produção e consumo sustentáveis realizadas	N.º	100	4.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 100% dos Marcos e Metas até ao 4º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A e 2 do Grupo B. Foram completas antecipadamente 1 Meta A (5.20) e 1 Meta B (598).

Informação complementar:

598:

- Desde o 3º Trimestre de 2024 que 5 ilhas já estão abrangidas pelo sistema de avisos agrícolas (Terceira, São Miguel, Faial, Graciosa e São Jorge) antecipando-se assim o cumprimento da Meta do 4T 2025.
- A plataforma deste sistema de avisos está disponível em <https://avisos.agricultura.azores.gov.pt/> e uma breve explicação do sistema em <https://avisos.agricultura.azores.gov.pt/videos-explicativos/>.

5.20:

- Foram contratados 24 projetos:
 - 17 projetos ao abrigo do [Aviso n.º 10/C05-i05-RAA/2022](#) - Regimes de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e à transição digital, destinados à reestruturação de empresas regionais do setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas;
 - 7 projetos ao abrigo do [Aviso n.º 11/C05-i05-RAA/2023](#) - Regimes de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e à transição digital, destinados à reestruturação de empresas regionais do setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas.

5.21:

- Foram contratados 198 projetos:
 - 17 projetos ao abrigo do [Aviso n.º 12/C05-i05-RAA/2023](#) – Regimes de Apoio à Inovação de produtos e Processos de produção e organização, à transição verde e à transição digital, destinados à reestruturação das explorações agrícolas;
 - 181 projetos ao abrigo do [Aviso n.º 13/C05-i05-RAA/2023](#) – Regimes de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e à transição digital, destinados à reestruturação das explorações agrícolas.

601:

- Foram realizadas 50 iniciativas para a promoção da literacia da população em produção e consumo sustentáveis.

● Condicionada

5.19:

- No âmbito do processo de reprogramação em curso, foi proposta a redução da ambição para 2 estruturas novas, retirando a empreitada de remodelação e ampliação do Matadouro do Pico, cujo último concurso ficou deserto em 3 dos 4 lotes;

- A empreitada de “Construção do novo Matadouro de São Jorge” encontra-se atrasada, situação que origina uma avaliação condicionada quanto à sua execução e cumprimento dos prazos contratualizados no âmbito do PRR.

5.22:

- No âmbito do processo de reprogramação em curso, foi proposta a redução da ambição desta meta.

Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 20: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	2	-	-	2	2
2	Grupo B	-	-	3	-	3	5
-	Grupo C	1	-	1	-	2	2
2*	Total	1*	2	4*	-	7	9

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (2+1+4=7)

Tabela 21: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
656	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	3	4.ºT 2022	B	Meta	NC	1.ºT 2025	●
6.10.1	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	780	4.ºT 2023	C	Meta	C	4.ºT 2024	●
6.11.1	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	7	4.ºT 2023	C	Meta	NC	1.ºT 2025	●
654	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	1040	4.ºT 2024	B	Meta	NC	1.ºT 2025	●
658	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	12	4.ºT 2024	B	Meta	NC	1.ºT 2025	●
6.10	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	1145	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
6.11	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	17	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; **NC:** Não Completo; **DP:** Dentro do Prazo; **A:** Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 43% dos Marcos e Metas até ao 4º trimestre de 2024, designadamente, 2 do Grupo B e 1 do Grupo C, não estando completos 3 do Grupo B e 1 do Grupo C.

● Condicionada:

6.10/654:

No âmbito das medidas M01 – Requalificação Profissional do Ensino Superior – Pós-graduações e M02 – Requalificação Profissional do Ensino Superior – Licenciaturas, foram lançados 7 Avisos de Abertura de Concurso (AAC), dos quais foram aprovadas, até ao 4.º trimestre de 2024, um total de 831 candidaturas.

No entanto, caso se considerem os 33 alunos que terminaram os cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), no âmbito da medida M03, o número adicional de adultos matriculados poderá ascender aos 864, aquém do objetivo proposto para o período de referência. Faz-se notar que estes alunos não foram contabilizados uma vez que a execução dos cursos ainda se encontra em análise.

À data de reporte, encontram-se por analisar 311 candidaturas no âmbito dos AAC 11/C06-i05-RAA/2023 e 12/C06-i05-RAA/2023 e 45 candidaturas no âmbito do AAC 24/C06-i05-RAA/2024, sendo que estas últimas não irão contabilizar para o cumprimento das metas associadas, uma vez que o AAC se destina a dar continuidade a ciclos de estudo iniciados nos anos letivos 2021/2022 e 2022/2023 e cuja candidatura tenha sido aprovada ao abrigo do AAC 02/C06-i05-RAA/2022 e ou 05/C06-i05-RAA/2022. Assim, potencialmente, poderão atingir-se os 1 175 adultos matriculados, caso todas as candidaturas que se encontram em análise sejam aprovadas, o que poderá não acontecer. Neste sentido, por forma a garantir o cumprimento da meta 6.10, no âmbito do processo de revisão do PRR foi proposta a redução de ambição para 953 adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores.

6.11:

Relativamente à empreitada de beneficiação e requalificação do Centro de Qualificação dos Açores, constata-se que está a decorrer a um bom ritmo, identificando-se, porém, um atraso na realização dos trabalhos em relação ao plano em vigor, uma vez que o nível de mão de obra é inferior ao previsto. A faturação encontra-se abaixo da previsão do cronograma financeiro, reflexo do atraso nos trabalhos. Não obstante, estão a ser envidados esforços para recuperar o atraso, nomeadamente através da realização de trabalhos ao sábado.

Informação complementar:

656/611.1/658:

No âmbito do AAC 10/C06-i05-RAA/2023, que compreende a atribuição de apoio para a modernização de escolas profissionais com intervenção na formação e reconversão profissional

de adultos no Açores, foram aprovadas e contratadas 16 candidaturas. Nos termos do ponto 8 do Aviso referente a prazos, “os investimentos devem ser iniciados até final do ano de 2023, impreterivelmente, e concluídos até final do ano de 2024”. No entanto, à data de referência, as candidaturas ainda não foram contabilizadas para cumprimento da meta, uma vez que a sua execução se encontra em análise.

Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 22: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	-	-	2
3	Grupo B	-	-	-	-	-	3
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
5*	Total	-	-	-	-	-	5

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (5)

Tabela 23: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 100% dos Marcos e Metas até ao 4.º trimestre de 2024, sendo 2 do Grupo A e 3 do Grupo B.

Informação complementar:

Das 10 empreitadas, 2 encontram-se concluídas (Variante S. Roque e Variante Portal do Vento) e as restantes estão em curso, com os seguintes percentuais de execução:

- Variante a Capelas – 4,89%
- Variante Furnas/Povoação – 87%
- Variante à Vila do Porto – 22,43%
- Variante à Madalena – 36,97%
- Transversal de S. Jorge – 13,03%
- Variante à Horta – 21,57%
- Ligação entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª (Graciosa) – 70,4%
- Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra do Heroísmo – 1,78%

Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"

(Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 24: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	1	-	-	1	2
1	Grupo B	-	1	-	1	2	3
3	Grupo C	-	-	1	-	1	4
5*	Total	-	2	1*	1	4	9

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (5+1=6)

Tabela 25: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
10.10.1	Pelo menos 50% das obras de construção do centro Tecnopolo MARTEC finalizadas	-	-	4.ºT 2024	C	Marco	NC	3.ºT 2025	●
10.9	Entrega de um navio de investigação	-	-	4.ºT 2025	A	Marco	DP		●
942	Conclusão da Empreitada de obras públicas	-	-	4.ºT 2025	B	Marco	A	2.ºT 2026	●
946	Conclusão da Construção e armamento	-	-	4.ºT 2025	B	Marco	DP		●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 83% dos Marcos e Metas previstos até ao 4.º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A, 1 do Grupo B e 3 do Grupo C, não estando completo o Marco C 10.10.1. Em relação ao Marco B 942, este encontra-se "Atrasado" e deverá ser cumprido até ao 4.º trimestre de 2025.

● Condicionada

10.10.1/942:

- Regista-se um atraso na execução da obra, considerando que se previa terminar no 4.º trimestre de 2024 com uma taxa de execução de 53,89%, verificando-se uma taxa de execução à data de 20,88%.

Investimento C10-i05-RAA – Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor das pescas e da aquicultura (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 26: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	-	-	-	-	-

* este investimento só tem marcos e metas no 1.ºT 2026

Tabela 27: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

A Meta 10.12 (A) – Conclusão de projetos no setor das pescas e da aquicultura, deverá ser implementada até ao 1.º trimestre de 2026.

Informação complementar:

10.12:

- O Aviso de Abertura de Concurso referente ao Sistema de Incentivos à Transição Energética, Digitalização e Redução do Impacto Ambiental no Setor da Pesca e da Aquicultura foi publicado a 09/01/2025.

Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 28: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	1	-	-	1	2
8	Grupo B	1	1	4	-	6	14
1	Grupo C	-	-	2	-	2	3
10*	Total	1*	2	6*	-	9	19

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (10+1+6=16)

Tabela 29: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
14.13.1	Novos sistemas de armazenamento de energia com baterias e sistemas de gestão de energia na RAA: início das obras nas ilhas do Faial, das Flores e do Corvo	-	-	4.ºT 2022	C	Marco	NC	X	X
1063	Início das obras nas ilhas São Jorge e Pico	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	NC	X	X
14.11.3	Contratação da instalação de novos grupos CGPV e CGPA	-	-	4.ºT 2023	C	Marco	NC	2.ºT 2025	●
1054	Contratação da instalação do novo grupo da CGRG	-	-	4.ºT 2024	B	Marco	NC	2.ºT 2025	●
1064	Conclusão das obras nas ilhas São Jorge, Faial e Flores	-	-	4.ºT 2024	B	Marco	NC	X	X
1068	Aumento da capacidade instalada em, pelo menos, 6,7 MW	MW	6,7	4.ºT 2024	B	Meta	C	-	●
14.14	Instalação de centrais fotovoltaicas de pequena dimensão para produção e consumo locais de eletricidade	MW	11,2	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
1055	Conclusão das obras e entrada em exploração dos novos grupos	-	-	4.ºT 2025	B	Marco	DP	-	●
1065	Conclusão das obras na ilha Pico	-	-	4.ºT 2025	B	Marco	NC	X	X

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 65% dos 17 Marcos e Metas até ao 4º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A, 9 do Grupo B e 1 do Grupo C, não estando completos 4 Marcos do Grupo B e 2 do Grupo C.

● Condicionada

14.11.3/1054/1055:

- Ampliação da Central Geotérmica do Pico Vermelho – o contrato de adjudicação foi assinado em 27/08/2024, tendo sido obtido o visto do Tribunal de Contas em 27/09/2024. A obra tem um prazo de execução de 611 dias, sendo que a sua conclusão deverá ocorrer no final do 2.º trimestre de 2026, no limite do prazo contratualizado no âmbito do PRR, se não ocorrem quaisquer percalços e/ou atrasos no decorrer da execução.
- Ampliação da Central Geotérmica do Pico Alto - No que se refere ao novo grupo da CG Pico Alto, a conclusão das especificações técnicas do Cadernos de Encargos que suportará a contratação, está pendente da caracterização da energia primária disponível nos poços geotérmicos cuja avaliação dos ensaios dos poços (marco 1052) terminou no final de 2023, continuando a aguardar-se os respetivos resultados.
- Revitalização da Central Geotérmica da Ribeira Grande – continua em preparação o caderno de encargos, com lançamento do respetivo concurso público previsto apenas no 2º trimestre de 2025, colocando assim em risco o cumprimento da meta respetiva, se esse prazo não for antecipado.

X Revogação do contrato – medida 3

1063/1064/1065/14.13.1:

- A EDA, SA, Entidade Executora desta medida, informou o Beneficiário Final e o Beneficiário Intermediário que existem razões objetivas que impedem a concretização deste investimento dentro dos prazos estipulados no PRR. Assim sendo, o contrato foi revogado.
- O BF, através do BI, apresentou à EMRP uma proposta de substituição da meta em causa por um reforço na medida 4, relativa ao SOLENERGE, que tem tido uma procura bastante elevada, aguardando-se a posição da Comissão Europeia sobre esta proposta.

Informação complementar:

1068:

- SOLENERGE:
 - 5.321 intenções de investimento submetidas;
 - 1.804 intenções de investimento aprovadas, das quais:
 - 1.470 instaladas e pagas
 - 334 instalações em execução

- 18.941.350,48€ de incentivo aprovado dos quais 13.783.223,02€ de incentivo pago;
- 13,9 MW de potência aprovada, com 10,1 MW de potência já instalada, em termos acumulados.

Investimento C16-i05-RAA – Capacitação Digital e Transformação das Empresas dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 30: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	-	-	-	-	-

* este investimento só tem marcos e metas no 2º. T 2026

Tabela 31: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

A Meta A 16.18 – Número de projetos concluídos no âmbito do Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas e o Marco A 16.19 – Parques de Ciência e Tecnologia ampliados ou equipados deverão ser implementados até ao 2.ºT de 2026.

Informação complementar:

16.18:

- Terminou a 30/12/2024 a fase final de submissão de candidaturas à medida AAB – Accelerate Azores Brand - [aviso 04/C16-i05-RAA/2024](#);
- A 20/12/2024 foram republicados os avisos [03/C16-i05-RAA/2024](#) – UDE – Upgrade Digital Empresarial e [05/C16-i05-RAA/2024](#) – EI – Empresarial Innovate, com a criação de uma nova fase de submissão de candidaturas (Fase 5) até 31/01/2025;
- Relativamente às candidaturas submetidas à medida UDE – Upgrade Digital Empresarial, na Fase 1, em dezembro de 2024 foram notificados 20 beneficiários com proposta de decisão de aprovação.

16.19:

- O contrato de empreitada do TERINOV foi assinado a 20/11/2024, cuja consignação ocorreu a 13/01/2025, com prazo de execução de 365 dias;
- Relativamente à aquisição do equipamento para o NONAGON, foi assinado o contrato para “Elaboração de projeto para requalificação e adaptação de espaço para instalação de data center” a 05/12/2024, sendo que se estima que o lançamento do concurso da empreitada de adaptação ocorrerá em março de 2025. O concurso público internacional para a aquisição do HPC está previsto para setembro de 2025 e a instalação do HPC para março de 2026.

Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 32: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	1	-	-	1	1
29	Grupo B	2	4	4	2	12	41
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
30*	Total	2*	5	4*	2	13	43

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (30+1+4=35)

Tabela 33: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1440	Fornecimento e instalação da plataforma tecnológica para assegurar a mobilidade do posto de trabalho de utilizadores da Administração Pública Regional	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	C	4.ºT 2024	●
1429	Meta intermédia 2.5 – Integração de, pelo menos, 5 serviços, através da eHUB-RAA	N.º	5	3.ºT 2024	B	Meta	NC	1.ºT 2025	●
1435	Meta intermédia 3.5 – Entrada em produção do Novo Portal de Serviços da APR (<i>front office e back office</i>)	N.º	1	3.ºT 2024	B	Meta	NC	3.ºT 2025	●
1436	Meta intermédia 3.6 – Disponibilização de 8 serviços no Simulador de Serviços transacionais e <i>online</i>	N.º	8	3.ºT 2024	B	Meta	NC	1.ºT 2025	●
1441	Meta intermédia 4.4 – Arranque do projeto-piloto com 50 utilizadores	N.º	50	3.ºT 2024	B	Meta	NC	2.ºT 2025	●
1442	Meta intermédia 4.5 – Migração de 5.000 utilizadores para a nova plataforma tecnológica	N.º	5000	1.ºT 2025	B	Meta	A	2.ºT 2025	●
1449	Meta intermédia 5.6 – Fornecimento e instalação de plataforma DLP (Data Loss Prevention) para suportar o Centro de Operações de Cibersegurança (SOC) - Azores_Ciber360	N.º	1	1.ºT 2025	B	Meta	A	3.ºT 2025	●

1424	Meta global 1 – Disponibilização de, pelo menos, 20 serviços mais acessíveis e inclusivos prestados pela Administração Pública Regional aos cidadãos e empresários, por via do redesenho do atendimento ao público e na criação do Catálogo Eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional (CES-APR).	N.º	20	3.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
1430	Meta global 2 – Disponibilização, pelo menos, 10 serviços geridos por entidades da Administração Pública Regional integrados na plataforma de interoperabilidade da Região Autónoma dos Açores, baseados em Free / Libre and Open Source Software (FLOSS)	N.º	10	3.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
1437	Meta global 3 – Disponibilização de, pelo menos, 15 serviços transacionais e online, geridos por entidades da Administração Pública Regional dos Açores, em sistema de simulação com o apoio de tecnologias emergentes e disruptivas integrado no Novo Portal dos Serviços da APR	N.º	15	3.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
1443	Meta global 4 – Assegurar a mobilidade do posto de trabalho para 10.000 utilizadores da administração pública regional, por via da criação do MOBILE.GOV.	N.º	10.000	3.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
1460	Meta global 7 – (Re)desenho de, pelo menos, 4 serviços públicos, de carácter inovador, assentes em metodologias de desenho de serviços públicos e em tecnologias digitais e/ou desenvolvidos em	N.º	4	3.ºT 2025	B	Meta	C	-	●

	cocriação com partes interessadas (academia, cidadãos e empresas, e.g.), em contexto de Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores.									
19.18	Digitalização da administração pública regional da RAA	-	-	4.ºT 2025	A	Marco	DP	-		●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 89% dos 35 Marcos e Metas previstos até ao 4.º trimestre de 2024, sendo 30 do Grupo B e 1 do Grupo C, não estando cumpridas 4 do Grupo B. Uma Meta B foi cumprida antecipadamente (1460).

● Condicionada

1441, 1442 e 1443:

- A 12/11/2024, foi emitido o auto de aceitação provisório do fornecimento, instalação e suporte da plataforma Mobile.Gov, verificando-se o cumprimento da meta 1440;
- Seguem-se as fases de implementação da plataforma tecnológica e de arranque do projeto-piloto, estimada para o 2.º trimestre de 2025, pelo que a meta 1441 se mantém não completa e a meta 1442 se encontra no estado atrasado;
- Apesar de a meta 1443 ser reportada como dentro do prazo, atendendo ao atraso identificado no arranque do projeto-piloto que visa assegurar a mobilidade do posto de trabalho para utilizadores da Administração Pública Regional, a mesma é assinalada como condicionada.

1435:

- O contrato de serviços de desenvolvimento do Portal de Serviços da Administração Pública Regional foi assinado a 16/12/2024, encontrando-se em execução. Assim, a meta mantém-se não completa;
- Conforme disposto no respetivo Caderno de Encargos, a implementação do Portal de Serviços está prevista para o 3.º trimestre de 2025. Dadas a complexidade do projeto e a proximidade do prazo para execução do investimento, assinala-se a meta como condicionada.

1449:

- Uma vez que o respetivo procedimento de contratação pública ainda não foi lançado, estando previsto para o decorrer do 1.º trimestre de 2025, prevê-se que a meta não seja cumprida no prazo contratualizado, tendo sido indicado novo prazo para implementação para 30/09/2025;
- Atendendo à proximidade do prazo para execução do investimento, assinala-se a meta como condicionada.

Informação complementar:

Relativamente à empreitada para criação do espaço Incuba.AÇORES – Laboratório de experimentação da Administração Pública Regional dos Açores, no âmbito da medida APR+Apta para o Futuro, estão neste momento a decorrer os trabalhos de demolição, que, face à atividade planeada, se encontram com um nível de execução superior.

Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto)

Tabela 34: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	3	-	-	3	4
6	Grupo B	3	-	-	-	3	9
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
8*	Total	3*	3	-	-	6	14

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (8+3=11)

Tabela 35: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1541	Aquisição de equipamentos digitais móveis	N.º	24900	4.ºT 2024	B	Meta	C	-	●
1545	Ambientes educativos inovadores	N.º	330	4.ºT 2024	B	Meta	C	-	●
1549	Conceção de MOOCs	N.º	16	4.ºT 2024	B	Meta	C	-	●
20.11	Novos computadores portáteis e tablets para escolas na RAA	N.º	31900	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●
20.12	Equipamento digital e recursos educativos digitais das escolas na RAA	-	-	4.ºT 2025	A	Marco	DP	-	●
20.13	Cursos em linha abertos a todos para pais e professores na RAA	N.º	24	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 100% dos Marcos e Metas até ao 4.º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A, 9 do Grupo B e 1 do Grupo C. Todos os Marcos e Metas, com o prazo inicial estipulado para o final do 4.º trimestre de 2025, encontram-se no estado “Dentro do Prazo”.

Informação complementar:

1541/20.11:

- Ponto de situação a 31/12/2024: foram adquiridos 25.452 equipamentos, sendo: 15.772 computadores portáteis, dos quais 8.744 foram adquiridos no âmbito dos manuais digitais; e 9.680 tablets, dos quais 7.680 foram adquiridos no âmbito dos manuais digitais;

1545/20.12:

- Verifica-se o cumprimento da Meta B 1545 com a aquisição de 392 painéis interativos. Esta meta contribui para o cumprimento do Marco A 20.12.
- A 31/12/2024 o ponto de situação do Marco 20.12 é o seguinte: adquiridos 392 painéis interativos dos quais 390 já se encontram instalados (decorre a fase de elaboração das peças do procedimento do concurso para aquisição de 700 painéis interativos, com previsão de lançamento para o 1.ºT de 2025), 1 672 equipamentos laboratoriais especializados, 134 impressoras 3D, 1 840 robôs educativos e 1 022 switches e APS (a decorrer fase de elaboração das peças do procedimento do concurso para aquisição de mais 146 switches e 463 AP's);
- Em relação às intervenções para implementar as infraestruturas de cablagem nas escolas, está em curso a empreitada nas ilhas das Flores e Corvo, e terminou o prazo para apresentação de propostas para 13 escolas na Terceira. Prevê-se o lançamento de concurso para empreitada em 26 escolas ainda no 1.ºT de 2025.
- Relativamente à desmaterialização dos manuais escolares até 4.ºT 2025, à data de 31/12/2024 foram atribuídas 13.613 licenças abrangendo os alunos do 5º ao 10º ano das escolas públicas e de 2 escolas privadas da região.
- No ano letivo de 2025/2026 serão atribuídos manuais aos alunos do 11º e 12º.

1549/20.13:

- Estão disponíveis um total de 18 cursos: 10 para professores e 8 para encarregados de educação;
- Encontram-se em desenvolvimento 6 novos cursos.

Investimento C21-i10-RAA – Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 36: Resumo dos Marcos e Metas – RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	1	-	-	1	1
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	1	-	-	1	1

Tabela 37: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
21.32	Instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade	MW	8,75	4.ºT 2025	A	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

A Meta 21.32 – Instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade, de pelos menos 8,75 MW de capacidade de armazenamento de eletricidade instalada para autoconsumo, deverá ser implementada até ao 4.ºT 2025.

Informação complementar:

21.32:

- O [Aviso 02/C21-i10-RAA/2024 – Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores](#), foi publicado a 22/07/2024;
- Este incentivo é complementar ao investimento C14-i03-RAA-m04 (SOLENERGE), ou seja, beneficiarão deste incentivo pessoas singulares e coletivas que tenham candidatura aprovada ao SOLENERGE;
- Até 31/12/2024 foram submetidas 447 candidaturas, com um investimento previsto de 4.715.030,94€, estando 153 candidaturas no estado contratado, com termo de aceitação outorgado e em fase de pagamento, 237 candidaturas em análise, 3 desistências e 54 encerradas (concluídas). Nesta data a potência contratada era de 724,08kW, sendo que o objetivo da Meta 21.32 é de 8,75 MW.

Investimento C21-i15-RAA – Aquisição de 2 ferries elétricos (Beneficiário Final – Atlânticoline S.A.)

Tabela 38: Resumo dos Marcos e Metas – RP 4.º T 2024

Completo até 3T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	1	1	2	2
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	-	1*	1	2	2

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2024 (1)

Tabela 39: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
21.40	Assinatura do contrato para a aquisição de dois ferries elétricos para o transporte de passageiros e veículos entre as ilhas de Pico, Faial e São Jorge	-	-	1.ºT 2024	A	Marco	NC	1.ºT 2025	●
21.41	Entrada em funcionamento de dois novos ferries elétricos	N.º	2	4.ºT 2025	A	Meta	A	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Crítica:

21.40/21.41:

Após recusa de assinatura do contrato por parte do adjudicatário, foi lançado, a 18/11/2024, um terceiro procedimento de contratação para aquisição de dois ferries elétricos para o transporte de passageiros e veículos entre as ilhas de Pico, Faial e São Jorge, com preço base superior aos anteriores e considerando a possibilidade de estender o prazo contratualizado para entrada em funcionamento dos 2 ferries para 30/06/2026. O prazo para apresentação de propostas terminou a 18/12/2024, tendo sido rececionadas duas propostas. No entanto, em sede de relatório preliminar, o júri propôs a exclusão de ambas e em 31/12/2024 aguardava-se o término do prazo de audiência prévia.

Tendo em conta os prazos decorridos sem se avançar com a contratualização e a necessidade de lançamento de novo concurso, aliado ao prazo de execução previsto, a execução do mesmo ultrapassaria o prazo de execução do PRR, comprometendo assim o cumprimento do objetivo contratualizado. Neste seguimento, foi apresentada, no âmbito da revisão do PRR em curso, a desistência deste investimento.

