

PRR-AÇORES

2º TRIMESTRE
**RELATÓRIO
PERIÓDICO DE
MONITORIZAÇÃO**
2024

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
30 de julho de 2024



FICHA TÉCNICA

Título

Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores – 2º Trimestre de 2024

Editor

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Endereço

Caminho do Meio, 58 – São Carlos

9701-853 Angra do Heroísmo

Tel.: +351 295 206 380

drepa@azores.gov.pt | prr.acores@azores.gov.pt

<https://portal.azores.gov.pt/web/drpfe/prr>

Data de Edição

30 de julho de 2024

ÍNDICE

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	4
RESUMO MARCOS & METAS.....	7
AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	8
Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)	8
Investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego).....	12
Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social).....	13
Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública).....	15
Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação)	18
Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)	19
Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	21
Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)	22
Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	23
Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	25
Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto).....	27
Investimento C21-i15-RAA – Aquisição de 2 ferries elétricos (Beneficiário Final – Atlânticoline S.A.)	29
MARCOS E METAS “A” REPROGRAMADAS	30
RESULTADO DA REPROGRAMAÇÃO – INVESTIMENTOS AÇORES	32

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS

A Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE), enquanto órgão de coordenação técnica e de monitorização, designado pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 23/2021/A, de 3 de setembro, tem como competência a elaboração e apresentação aos órgãos de coordenação política e de acompanhamento, de relatórios periódicos de monitorização e relatórios anuais de progresso, bem como responder às demais necessidades de informação desses órgãos.

Nestes termos, o cronograma estabelecido para a elaboração dos relatórios acima referidos é o seguinte:

- Relatórios Periódicos de Monitorização (Trimestrais) – **elaboração até ao último dia do mês seguinte ao final de cada trimestre**, com base exclusivamente nos Relatórios de Progresso (RP) dos Beneficiários Finais (BF), relativos ao ponto de situação dos Marcos e Metas desse trimestre e dos quatro trimestres seguintes;
 - Nota: os BF elaboram RP trimestrais até ao dia 10 do mês seguinte ao final de cada trimestre.
- Relatórios Anuais de Progresso – **elaboração até ao final de fevereiro do ano seguinte**, relativos a aspetos globais da gestão e da execução do PRR-Açores, incluindo, entre outras, questões relativas a ações de acompanhamento e auditoria; combate à corrupção, fraude, duplo financiamento e segregação de funções; ao princípio de não prejudicar significativamente o ambiente (DNSH) e estratégia de comunicação.

Este 11º Relatório Periódico de Monitorização, à semelhança dos anteriores, tem por base a informação inserida no Sistema de Informação do PRR (SI PRR) pelos BF, no início do mês de julho de 2024, relativa ao segundo Relatório de Progresso Trimestral de 2024, referente aos doze investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência para os Açores com marcos e metas no período objeto deste Relatório.

Em outubro de 2023, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia, respetivamente, avaliaram positivamente a reprogramação do PRR e adotaram uma nova [Decisão de Execução do Conselho \(CID\)](#), a qual inclui alterações em 18 Metas do Grupo A nos atuais 11 investimentos do PRR-Açores (Tabela 28) e alterações financeiras em 5 deles, resultando num reforço da ambição inicial, para além da aprovação de 7 novos investimentos (Tabela 29).

O período de reporte é o 2.º Trimestre de 2024, com uma análise que incide também sobre os Marcos e Metas dos Grupos A, B e C considerados “Não Completos” nos trimestres anteriores, e uma análise sobre os Marcos e Metas dos Grupo A, B e C a cumprir nos quatro trimestres seguintes (até ao 2.º Trimestre de 2025).

Com base nas evidências dos indicadores dos Marcos e Metas a atingir, apresentadas pelos BF, que inclui o prazo contratualizado e os mecanismos de verificação constantes no [Acordo Operacional](#) (aguarda-se publicação do novo Acordo Operacional), o estado dos Marcos e Metas é classificado como “Completo” ou “Não Completo”, no que concerne aos Marcos e Metas do trimestre objeto do Relatório de Progresso e dos trimestres anteriores, e classificado como “Dentro do Prazo” ou “Atrasado” para os Marcos e Metas dos quatro trimestres seguintes.

Independentemente do estado dos Marcos e Metas, o Beneficiário Intermediário estabelece uma avaliação sobre a informação/evidências/dificuldades apresentadas pelos BF, que reflete se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, e que se traduz numa avaliação Favorável (●), Condiçãoada (●) ou Crítica (●).

Os Marcos e Metas do Grupo A, denominadas de “desembolso”, são aqueles cujo seu cumprimento viabiliza os pedidos de pagamento por parte da Comissão Europeia ao Estado Membro, e como tal, o seu cumprimento deverá ser rigoroso, não só na sua dimensão quantitativa, mas também qualitativa e temporal, cumprindo plenamente os objetivos que pretendiam alcançar e os requisitos contratuais e ambientais.

Os Marcos e Metas do Grupo B, funcionam como indicadores de monitorização do estado de execução dos investimentos, cujo cumprimento permite garantir o alcance dos Marcos e Metas do Grupo A, servindo de alerta na eventualidade de não serem cumpridos no calendário previamente definido.

Os Marcos e Metas do Grupo C, que constam do anexo II do anterior [Acordo Operacional](#), foram definidos pela Comissão Europeia, e funcionam como indicadores de monitorização associados a algumas metas do Grupo A, cuja monitorização será acompanhada, adicionalmente, nos prazos estabelecidos e, em alguns casos, são coincidentes com Marcos e Metas do Grupo B.

A análise neste Relatório Periódico de Monitorização incidiu sobre o nível de execução de 73 Marcos e Metas, deste trimestre e dos quatro trimestres seguintes, incluindo os não completos em trimestres anteriores, com a distribuição temporal expressa na Tabela 1.

Tabela 1: Número de Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Metas	2021		2022				2023				2024				2025		Total
	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T		
Grupo A	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4	
Grupo B	1	-	1	1	6	3	1	5	6	5	2	11	12	6	-	60	
Grupo C	-	1	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	1	-	-	9	
Total	1	1	1	1	7	3	1	5	11	7	4	12	13	6	-	73	

Neste Relatório Periódico de Monitorização procede-se também a uma análise relacionada com os Marcos e Metas anteriormente completos, conforme consta na Tabela 2 e subsequentes relativas à análise individual dos investimentos.

Tabela 2: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024, com acumulado dos completos

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
9	Grupo A	1	1	2	-	4	13
90	Grupo B	8	17	24	11	60	150
11	Grupo C	1	1	7	-	9	20
110*	Total	10*	19	33*	11	73	183

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (110+10+33=153)

Assim, constata-se que já foram cumpridos 78% dos 153 Marcos e Metas dos Grupos A, B e C que deveriam estar concluídos até ao 2.ºT de 2024, o que representa, globalmente, um bom nível de execução dos investimentos do PRR-Açores.

Analisando na perspetiva de cada um dos investimentos, verifica-se que 6 tem uma execução acima da média, conforme refletido na tabela seguinte:

Tabela 3: Marcos e Metas a cumprir até ao 2.ºT 2024


Investimento	Completo	Não Completo	Total	%
C01-i08-RAA	50	17	67	75%
C02-i04-RAA	3	0	3	100%
C03-i04-RAA	6	1	7	86%
C05-i04-RAA	5	2	7	71%
C05-i05-RAA	2	1	3	67%
C06-i05-RAA	1	4	5	20%
C07-i05-RAA	4	1	5	80%
C10-i04-RAA	5	0	5	100%
C14-i03-RAA	8	5	13	62%
C19-i06-RAA	28	1	29	97%
C20-i02-RAA	8	0	8	100%
C21-i15-RAA	0	1	1	0%
Total	120	33	153	78%

RESUMO MARCOS & METAS

Resumo 11º RP - 2ºT 2024

TOTAL
73

Investimento	Marcos & Metas					Não completo/Atrasado	Completo/Dentro do prazo
	2021	2022	2023	2024	2025		
C01-i08-RAA	1	6	11	12	4	21	13
C02-i04-RAA	0	0	1	0	0	1	1
C03-i04-RAA	0	0	1	4	0	4	1
C05-i04-RAA	0	1	1	2	0	3	1
C05-i05-RAA	0	0	1	0	0	1	0
C06-i05-RAA	0	2	2	2	0	4	2
C07-i05-RAA	0	0	0	1	0	1	1
C10-i04-RAA	0	0	0	1	0	1	1
C14-i03-RAA	0	1	2	5	0	5	3
C19-i06-RAA	0	0	1	5	2	4	4
C20-i02-RAA	0	0	0	3	0	3	3
C21-i15-RAA	0	0	0	1	0	1	1
Total Geral	1	10	20	36	6	44	29

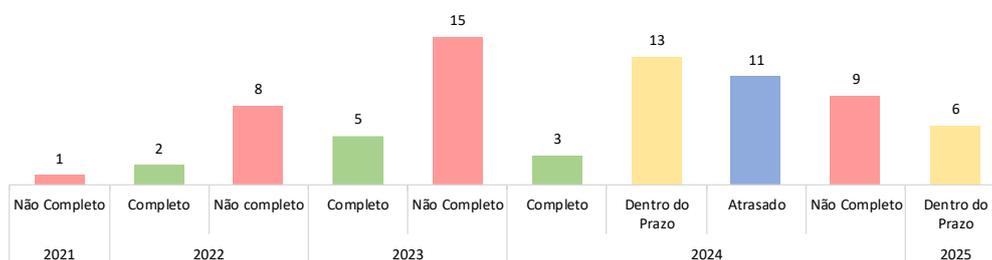

Completo	Dentro do prazo	Atrasado	Não completo	
7	6	4	17	C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
1	0	0	0	C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da RAA
0	1	3	1	C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social
1	0	1	2	C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores
0	0	0	1	C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana
0	2	0	4	C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA
0	0	0	1	C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores
0	1	0	0	C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"
0	3	0	5	C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores
1	3	3	1	C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA
0	3	0	0	C20-i02-RAA - Educação digital (Açores)
0	0	0	1	C21-i15-RAA - Aquisição de 2 ferries elétricos

AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS

Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
 (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 4: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	1	-	-	1	1
40	Grupo B	7	5	16	4	32	72
3	Grupo C	-	-	1	-	1	4
43*	Total	7*	6	17*	4	34	77

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (43+7+17=67)

Tabela 5: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
181	Garantir a implementação e interligação 2 sistemas: Nascer Utente/Notícia Nascimento; Programa e-vacinas	N.º	2	4.ºT 2021	B	Marco	NC	4.ºT 2024	●
211	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	2.ºT 2022	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
212	Desenvolvimento e testes para implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	3.ºT 2022	B	Marco	C	-	●
197	Entrada em produção do sistema de consolidação financeira do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	NC	4.ºT 2024	●
220	Entrada em produção do sistema de evacuações e emergências do SRS.	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
248	Desenvolvimento e testes no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
258	Assegurar a aquisição de 60% equipamentos informáticos	%	60	4.ºT 2022	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
205	Entrada em produção de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.	-	-	1.ºT 2023	B	Marco	C	-	●

216	Implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS	N.º	1	1.ºT 2023	B	Meta	NC	3.ºT 2024	●
249	Entrada em produção de um sistema no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	1	1.ºT 2023	B	Marco	NC	4.ºT 2024	●
250	Entrada em produção de dois sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	2	2.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
183	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal dos utentes	N.º	1	3.ºT 2023	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
188	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal do Profissional de Saúde	N.º	1	3.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
228	Desenvolvimento e testes no âmbito da integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório/áreas produtoras de imagem)			3.ºT 2023	B	Marco	C	-	●
251	Entrada em produção de três sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	3	3.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
207	Entrada em produção.	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	C	-	●
229	Entrada em produção da integração de anatomia patológica	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	NC	4.ºT 2024	●
256	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades	%	100	4.ºT 2023	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
201	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	C	-	●
213	Entrada em produção do sistema	-	-	1.ºT 2024	B	Marco	C	-	●
230	Entrada em produção da integração de laboratórios	-	-	1.ºT 2024	B	Marco	NC	4.ºT 2024	●
244	Garantir a interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	5	1.ºT 2024	B	Meta	NC	3.ºT 2025	●
1.36.2	Entrada em produção da solução tecnológica que suporta o portal de acesso digital ao processo clínico	N.º	1	1.ºT 2024	C	Marco	NC	1.ºT 2025	●
185	Validação e atribuição de acessos ao portal do utente	N.º	15000	3.ºT 2024	B	Marco	A	1.ºT 2025	●

190	Validação e atribuição de acessos aos profissionais de saúde	N.º	1000	3.ºT 2024	B	Marco	A	3.ºT 2025	●
214	Formação e Projeto-Piloto	-	-	3.ºT 2024	B	Marco	C	-	●
225	Garantir a integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório / áreas produtoras de imagem)	N.º	3	3.ºT 2024	B	Meta	A	1.ºT 2025	●
252	Entrada em produção dos cinco sistemas	N.º	5	3.ºT 2024	B	Marco	A	3.ºT 2025	●
1.37	Introdução de consultas de telemedicina no Serviço Regional de Saúde dos Açores	N.º	1000	3.ºT 2024	A	Meta	DP	-	●
243	Entrada em produção na íntegra	-	-	4.ºT 2024	B	Marco	DP	-	●
208	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	N.º	1	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
215	Entrada em produção.	-	-	1.ºT 2025	B	Marco	DP	-	●
232	Desmaterialização de valências de MCDT's	N.º	10	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
237	Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários.	N.º	1	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 75% dos 67 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2024, sendo 47 do Grupo B e 3 do Grupo C, não estando completos 16 do Grupo B e 1 do Grupo C.

Informação complementar:

Meta Principal		Metas Associadas		Ponto de Situação
Número	Grupo	Número	Grupo	
1.36	A	183	B	Os trabalhos de desenvolvimento do projeto MUSA, onde se enquadra o portal do utente iniciaram-se em março de 2024. Prevê-se que em setembro de 2024 o Portal do Utente (App móvel e portal desktop) esteja disponível para acesso, sendo que as funcionalidades serão disponibilizadas de forma evolutiva a partir desta data.
		185	B	
		1.36.1	C	
		1.36.2	C	
		1.36.3	C	
1.37	A	222	B	Dados relativos às teleconsultas publicados pelo SREA.
		224	B	
		1.37.1	C	
186	B	187	B	O portal do profissional de saúde será desenvolvido no âmbito do projeto MUSA, que já se encontra em fase de desenvolvimento, no entanto, foi dada prioridade ao Portal do Utente, atrasando um pouco o desenvolvimento deste Portal.
		188	B	
		190	B	
191	B	192	B	Em outubro de 2023 foi adjudicada a aquisição de serviços de implementação e licenciamento do Sistema de Consolidação Financeira do SRS. Foi lançado o procedimento para o Sistema
		193	B	
		194	B	

		195	B	de Gestão de Equipamentos.
		196	B	Em curso uma consulta de mercado para o desenvolvimento do Portal.
		197	B	
		199	B	
		200	B	
		202	B	
201	B	203	B	A diversidade e falta de procedimentos padronizados foram vistas como barreiras significativas à implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos, não sendo, por isso, desenvolvido este sistema. Em vez disso, e tendo em conta as necessidades identificadas, foram adquiridos módulos de formação para os Hospitais da Horta e Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.
		204	B	
		205	B	
		206	B	
		207	B	
208	B	209	B	No âmbito desta meta não será criado, como previsto inicialmente, um sistema integrado de Gestão de Stocks dos Hospitais, será apenas desenvolvido o projeto HDES: Mobile Health.
		210	B	
		211	B	
		212	B	
		213	B	
		214	B	
216	B	217	B	Está em curso o desenvolvimento do Projeto MedEvac. A entrada em produção do sistema estava prevista para o 1ºT de 2024, no entanto, a fase de testes prolongou-se e foram detetadas algumas falhas, o que prolongou o prazo de implementação para o 3ºT de 2024.
		218	B	
		219	B	
		220	B	
225	B	226	B	Lançado o procedimento para a celebração de contratos para a Digitalização dos Serviços de Anatomia Patológica do HDES e HSEIT. Lançado o procedimento de contratação para a integração de laboratórios., o que prolongou o prazo de implementação para o 3ºT de 2024. Implementação em curso. A integração de áreas produtoras de imagens, foi desenvolvida no âmbito da meta 232.
		227	B	
		228	B	
		229	B	
		230	B	
232	B	231	B	
		233	B	No âmbito do projeto bHealth foram implementadas as especialidades de Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Urologia e Angiologia e Cirurgia Vascular.
		234	B	
		235	B	
236	B			
237	B	238	B	Foi concretizada a aquisição de serviços de modernização da aplicação MedicineOne. As melhorias adicionais do sistema MedicineOne estão em fase de convite para adjudicação.
		239	B	
		240	B	
		241	B	
		242	B	
244	B	243	B	
		245	B	A interoperabilidade e otimização de pelo menos 5 sistemas de informação também será assegurada pelo desenvolvimento do projeto MUSA, já em curso.
		246	B	
		247	B	
		248	B	
		249	B	
		250	B	
251	B			
253	B	252	B	
		254	B	Foi adquirido 100% do número dos equipamentos hospitalares previstos.
256	B	255	B	
		257	B	A decorrer.
		258	B	

Investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 6: Resumo dos Marcos e Metas – RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	1	-	-	-	1	3
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2*	Total	1*	-	-	-	1	3

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (2+1=3)

Tabela 7: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
2.16	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – renovação	N.º	101	4.ºT 2023	A	Meta	C	2.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Neste momento, já estão cumpridas todas as Metas do Grupo A cujo prazo inicial previa a sua concretização até ao 4.º trimestre de 2023.

Nem todas as metas B foram já ajustadas e corrigidas na sequência deste processo de Reprogramação (exemplo: retirada das Meta 358, 359, 362 e 363 deste período de análise, até ajustamento em conformidade).

Informação complementar:

2.16:

- A conclusão das 61 habitações renovadas ficou confirmada durante o mês de junho.

Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 8: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
5	Grupo B	-	1	1	3	5	10
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
6*	Total	-	1	1*	3	5	11

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (6+1=7)

Tabela 9: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
441	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	20	3.ºT 2024	B	Meta	A	1.ºT 2026	●
442	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	80	3.ºT 2024	B	Meta	A	1.ºT 2026	●
445	Viaturas adquiridas	N.º	66	4.ºT 2023	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
439	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas	N.º	671	4.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
446	Viaturas adquiridas	N.º	83	4.ºT 2024	B	Meta	A	1.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 86% dos 7 Marcos e Metas até ao 2.º trimestre de 2024, sendo 5 do grupo B e 1 do grupo C. Não ficaram completos 1 do grupo B.

Informação complementar:

Meta 439:

- Face ao 1.º trimestre de 2024, houve um aumento de 24 vagas, perfazendo um total de 651 novas vagas nas creches.

Metas 445 e 446:

- No âmbito do Programa “Gerações em Movimento” foram aprovadas:
 - 8 viaturas em edições anteriores aos avisos;

- Na 1.ª Fase ([Aviso 02/C03-i04-RAA/2022](#), publicado a 06/01/2022, com uma dotação global de 1 500 000 €), foram aprovadas 41 viaturas, sendo que 33 já foram entregues às instituições, 5 foram adjudicadas ao fornecedor, estando com contrato já publicado no Portal BASE e a aguardar entrega e 3 estão adjudicadas, porém a aguardar publicação no Portal BASE;
- Na 2.ª Fase ([Aviso 04/C03-i04-RAA/2022](#), publicado a 30/06/2022, com uma dotação global de 1 200 000 €), foram aprovadas 30 viaturas, das quais 13 foram entregues às instituições, 13 foram adjudicadas ao fornecedor e aguardam entrega e 4 estão em fase de contratação pública prévia à adjudicação;
- Na 3.ª Fase ([Aviso 15/C03-i04-RAA/2023](#), publicado a 26/06/2023, com uma dotação global de 975 000 €), foram aprovadas 24 viaturas, já contratualizadas com as IPSS. Destas, 1 foi entregue à instituição, 11 foram adjudicadas ao fornecedor e aguardam entrega do bem e 12 estão em fase de contratação pública prévia à outorga do contrato.
- Assim, à data de 30/06/2024, foram entregues 55 viaturas às IPSS e 32 encontram-se adjudicadas ao fornecedor.

● Condicionada

Metas 441 e 442:

- O ponto de situação das várias obras é o seguinte:
 - Os trabalhos da obra de construção do Lar Residencial e CAO da Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa tiveram início a 05/02/2024;
 - O projeto da obra de construção do CACI da Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico foi licenciado a 15/04/2024, encontrando-se a ser desenvolvido;
 - A obra de Ampliação e Remodelação do Lar Residencial Kavivo da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia teve o projeto de arquitetura aprovado pelo respetivo município no dia 18/05/2023. O concurso público da empreitada, lançado a 06/12/2023, encontra-se na fase de elaboração do relatório preliminar;
 - O concurso da empreitada da obra de adaptação de imóvel a Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, lançado a 19/12/2023, encontra-se em fase de análise de propostas;
 - O projeto de arquitetura da obra de CACI e Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia da Horta foi entregue a 13/06/2024 e encontra-se em fase de licenciamento;
 - O concurso público para construção de CATL inclusivo e Centro de Dia especializado nas Lajes das Flores foi lançado e encontra-se na fase de elaboração do relatório preliminar.
- Prevê-se, por conseguinte, a disponibilização de novas vagas para pessoas com deficiência no decorrer do 2.º semestre de 2026, havendo, no entanto, a possibilidade deste prazo não ser cumprido, em particular, nos casos em que o processo de contratação pública não se encontra efetivado.

Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 10: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	-	-	2
1	Grupo B	-	-	-	1	1	2
1	Grupo C	1	-	2	-	3	4
4*	Total	1*	-	2*	1	4	8

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (4+1+2=7)

Tabela 11: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
5.17.2	Desenvolvimento e adoção, por parte do gestor do veículo, de pelo menos dois programas de investimento no total. Os programas de invest. devem ser desenvolvidos e adotados pelo BPF, organismo de gestão do veículo, e, no quadro estabelecido pela política de investimento, devem descrever a finalidade e a dimensão indicativa do programa, enumerar os instrumentos financeiros que podem aplicar, pormenorizar os critérios de seleção / elegibilidade para as empresas apoiadas e especificar os objetivos de investimento e retornos visados	-	-	1.ºT 2022	C	Marco	C	-	●
5.17.4	Apresentação de um relatório anual que comprove a entrega de um total de 50 000 000 EUR às empresas não financeiras da região em apoio de capital e quase capital, em conformidade com a política de investimento do instrumento, incluindo informações sobre:	-	-	4.ºT 2023	C	Meta	NC	2.ºT 2025	●

	investimentos efetuados para cada tipo de programa de investimento, taxas de rentabilidade esperadas, custos administrativos suportados, eventuais alienações, reembolsos e conversões em subvenções.								
5.17.3	Desenvolvimento e adoção, por parte do gestor do veículo, de pelo menos quatro programas de investimento no total, cuja dimensão agregada indicativa abrange a totalidade da meta de apoio (125 000 000 EUR). Os programas de investimento devem ser desenvolvidos e adotados pelo BPF, organismo de gestão do veículo, e, no quadro estabelecido pela política de investimento, devem descrever a finalidade e a dimensão indicativa do programa, enumerar os instrumentos financeiros que podem aplicar, pormenorizar concretamente os critérios de seleção/elegibilidade para as empresas apoiadas e especificar os objetivos de investimento e retornos visados.	-	-	2.ºT 2024	C	Marco	NC	4.ºT 2024	●
595	Entrega de um total de EUR 75 milhões ao tecido empresarial regional, em auxílio de Estado à capitalização. Indicativamente, estima-se que, até a 2024, sejam apoiadas pelo menos 150 empresas.	N.º	150	4.ºT 2024	B	Meta	A	2.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; **NC:** Não Completo; **DP:** Dentro do Prazo; **A:** Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 71% dos 7 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2024, sendo 2 do Grupo A, 1 do Grupo B e 2 do Grupo C, não estando completos 2 marcos do Grupo C.

● Crítica

5.17.4:

- A meta refere-se à elaboração de um relatório que comprove a entrega de 50 milhões de euros às empresas não financeiras da Região. Segundo informação reportada pelo beneficiário, existem 16 candidaturas ao CPA I das quais 4 foram aprovadas, com um valor de 631.031,29€ e 9 estão em análise, com um valor proposto de 1.323.243,10€.

595:

- De acordo com o reporte efetuado pelo BF estima-se um atraso de dois trimestres para cumprimento da meta passando para o 2ºT/2025, considera-se assim que a sua execução é crítica, considerando a baixa adesão ao programa lançado com um capital de 20 milhões de euros.

● Condicionada

5.17.3:

- Estão implementados o Capital Participativo I, em fase de aceitação de candidaturas pelos Beneficiários Finais e o Capital Participativo II, em fase de credenciação dos coinvestidores/intermediários financeiros. Os restantes instrumentos e a respetiva tipologia serão analisados no segundo semestre de 2024.

Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação)

Tabela 12: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	-	-	1
1	Grupo B	-	-	1	-	1	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2*	Total	-	-	1*	-	1	3

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2ºT de 2024 (2+1=3)

Tabela 13: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
599	Ilhas com sistema de avisos agrícolas	N.º	2	4.ºT 2023	B	Meta	NC	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 67% dos Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A e 1 do Grupo B, não estando completo 1 do Grupo B.

● Condicionada

599:

O contrato para o desenvolvimento de uma rede de monitorização e avisos agrícolas foi assinado no dia 29/02/2024, prevendo-se o cumprimento desta meta até ao final do 3º trimestre de 2024.

Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 14: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
1	Grupo B	-	2	2	-	4	5
-	Grupo C	-	-	2	-	2	2
1*	Total	-	2	4*	-	6	7

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (1+4=5)

Tabela 15: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
652	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	520	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
656	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	3	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
6.10.1	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	780	4.ºT 2023	C	Meta	NC	4.ºT 2024	●
6.11.1	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	7	4.ºT 2023	C	Meta	NC	4.ºT 2024	●
654	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	1040	4.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
658	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	12	4.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos apenas 20% dos Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2024, nomeadamente 1 do Grupo B, não estando completos 2 do Grupo B e 2 do Grupo C.

● Crítica

Meta 652/6.10.1/654:

- Nos avisos ainda abertos (Aviso 11/C06-i05-RAA/2023 e Aviso n.º 12/C06-i05-RAA/2023) foram apresentadas 912 candidaturas, estando analisadas 764, resultando na aprovação de 378 candidaturas e no indeferimento de 386. A situação atual destas metas é de 517 alunos (Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores), cumprindo o objetivo definido para a meta do 4º trimestre de 2021 (Meta 651), mas estando aquém do objetivo definido para o 4º trimestre de 2023 de 780 alunos (Meta 6.10.1), algo que pode condicionar o cumprimento da meta A (6.10), prevista para o 4º trimestre de 2025 (1145 alunos).

● Condicionada

Meta 656/6.11.1/658:

- Foi lançado, no mês de julho de 2023, o aviso para o apoio à modernização das escolas profissionais da Região Autónoma dos Açores, ao qual foram submetidas 16 candidaturas, estando todas aprovadas e contratadas.
- Foi assinado a 05/01/2024 o contrato de empreitada de beneficiação e requalificação do Centro de Qualificação dos Açores, tendo a obra iniciado em junho de 2024.

Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 16: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	-	-	2
2	Grupo B	-	-	1	-	1	3
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
4*	Total	-	-	1*	-	1	5

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (4+1=5)

Tabela 17: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
715	Contratos de empreitada todos assinados: 10 contratos assinados	-	-	2.ºT 2024	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 80% dos Marcos e Metas até ao 2.º trimestre de 2024, sendo 2 do Grupo A e 2 do Grupo B. O Marco B, a cumprir até ao 2º trimestre de 2024, encontra-se “Não Completo”.

Informação complementar:

715:

- Assinados 9 contratos de empreitada:
 - Variante S. Roque;
 - Variante Portal do Vento;
 - Variante a Capelas;
 - Variante Furnas/Povoação;
 - Variante à Vila do Porto;
 - Variante à Madalena;
 - Transversal de S. Jorge;
 - Variante à Horta;
 - Ligação entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª.
- Ligação entre Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra do Heroísmo: posse administrativa dos terrenos concluída e abertura do concurso público para adjudicação da empreitada. Prevê-se assinatura do contrato durante o 3.º trimestre de 2024.

Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 18: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	-	-	1
1	Grupo B	-	-	-	-	-	1
3	Grupo C	-	1	-	-	1	4
5*	Total	-	1	-	-	1	6

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (5)

Tabela 19: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
941	Pelo menos 50% das obras de construção do centro Tecnopolo MARTEC finalizadas	-	-	4.ºT 2024	C	Marco	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos todos os Marcos e Metas até ao 2.º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A, 1 do Grupo B e 3 do Grupo C. O Marco C 941, a cumprir até ao 4.º trimestre de 2024, encontra-se "Dentro do Prazo".

Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 20: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	1	-	1	1
7	Grupo B	-	3	2	-	5	12
1	Grupo C	-	-	2	-	2	3
8*	Total	-	3	5*	1	8	16

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (8+5=13)

Tabela 21: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
14.13.1	Novos sistemas de armazenamento de energia com baterias e sistemas de gestão de energia na RAA: início das obras nas ilhas do Faial, das Flores e do Corvo	-	-	4.ºT 2022	C	Marco	NC	4.ºT 2024	●
14.12	Produção adicional de eletricidade renovável no Corvo	kW	850	2.ºT 2024	A	Meta	NC	3.ºT 2024	●
1059	Conclusão das obras do PF e PE	-	-	2.ºT 2024	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
1063	Início das obras nas ilhas São Jorge e Pico	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
14.11.3	Contratação da instalação de novos grupos CGPV e CGPA	-	-	4.ºT 2023	C	Marco	NC	4.ºT 2024	●
1054	Contratação da instalação do novo grupo da CGRG	-	-	4.ºT 2024	B	Marco	DP	-	●
1064	Conclusão das obras nas ilhas São Jorge, Faial e Flores	-	-	4.ºT 2024	B	Marco	DP	-	●
1068	Aumento da capacidade instalada em, pelo menos, 6,7 MW	MW	6,7	4.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condiçãoada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 62% dos 13 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2024, sendo 7 do Grupo B e 1 do Grupo C, não estando completos 1 Meta do Grupo A, 2 Marcos do Grupo B e 2 do Grupo C.

● Condicionada

14.11.3:

- Prevê-se a contratualização da aquisição dos equipamentos da Central Geotérmica da Praia da Vitória e da Central Geotérmica do Pico Alto no 3º trimestre de 2024:
 - CGPV - Realizado concurso público para o “Contrato de conceção, construção, fornecimento, montagem, ensaios e entrada em serviço da Ampliação da Central Geotérmica do Pico Vermelho de 10 a 11”, não tendo sido rececionadas propostas válidas. No 1º trimestre de 2024 foi aberto novo concurso público, estando em fase de adjudicação do contrato;
 - CGPA - No que se refere ao novo grupo da CG Pico Alto, a conclusão das especificações técnicas do Cadernos de Encargos que suportará a contratação, está pendente da caracterização da energia primária disponível nos poços geotérmicos cuja avaliação dos ensaios dos poços (marco 1052) terminou no final de 2023, continuando-se a aguardar os respetivos resultados.

1059/14.12

- Parque Fotovoltaico concluído e conclusão do Parque Eólico prevista para 3º trimestre de 2024, registando-se um atraso relativamente ao prazo contratualizado.

● Crítica

1063/1064/14.13.1:

- A EDA, SA, Entidade Executora desta medida, já informou o Beneficiário Final bem como o Beneficiário Intermediário, que existem razões objetivas que impedem a concretização deste investimento dentro dos prazos regulamentares do PRR. Assim sendo, o contrato será revogado. O BF, através do BI, apresentará à EMRP uma proposta de substituição da meta em causa por um reforço na medida 4, relativa ao SOLENERGE, que tem tido uma procura bastante elevada.

Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 22: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
26	Grupo B	1	3	1	3	8	34
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
27*	Total	1*	3	1*	3	8	35

* corresponde ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (27+1+1=29)

Tabela 23: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1434	Entrega do produto mínimo viável para o Simulador de serviços transacionais e online com 3 serviços disponíveis	N.º	3	3.ºT 2023	B	Meta	C	-	●
1440	Fornecimento e instalação da plataforma tecnológica para assegurar a mobilidade do posto de trabalho de utilizadores da Administração Pública Regional	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	NC	3.ºT 2024	●
1429	Meta intermédia 2.5 – Integração de, pelo menos, 5 serviços, através da eHUB-RAA	N.º	5	3.ºT 2024	B	Meta	A	1.ºT 2025	●
1435	Meta intermédia 3.5 – Entrada em produção do Novo Portal de Serviços da APR (<i>front office e back office</i>)	N.º	1	3.ºT 2024	B	Meta	A	1.ºT 2025	●
1436	Meta intermédia 3.6 – Disponibilização de 8 ervices no Simulador de Serviços transacionais e <i>online</i>	N.º	8	3.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
1441	Meta intermédia 4.4 – Arranque do projeto-piloto com 50 utilizadores	N.º	50	3.ºT 2024	B	Meta	A	4.ºT 2024	●
1442	Meta intermédia 4.5 – Migração de 5.000 utilizadores para a nova plataforma tecnológica	N.º	5000	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●
1449	Meta intermédia 5.6 – Fornecimento e instalação de plataforma DLP (Data	N.º	1	1.ºT 2025	B	Meta	DP	-	●

Loss Prevention) para suportar o Centro de Operações de Cibersegurança (SOC) - Azores_Ciber360

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 97% dos 29 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2024, sendo 27 do Grupo B e 1 do Grupo C, não estando cumprido 1 do Grupo B.

● Condicionada

1440:

- O contrato foi visado pelo Tribunal de Contas, aguardando-se o pagamento dos emolumentos para início da sua execução. A meta encontra-se no estado “Não completo”, prevendo-se que o fornecimento e instalação da plataforma tecnológica decorram no 3.º trimestre de 2024.

1429:

- O procedimento de contratação para fornecimento da plataforma encontra-se em fase de preparação. Dado o prazo contratualizado para execução da meta, esta considera-se em estado “Atrasado”. Prevê-se que a solução tecnológica entre em funcionamento no decorrer do 1.º trimestre de 2025.

1435:

- Ainda não foi lançado o procedimento de contratação, estando em fase de consolidação final do caderno de especificações técnicas. Considerando o prazo contratualizado para execução da meta, esta considera-se em estado “Atrasado”, prevendo-se que o Novo Portal de Serviços da APR entre em funcionamento no decorrer do 1.º trimestre de 2025.

1441:

- Face ao não cumprimento da meta 1440 e ao prazo contratualizado da meta 1441, esta considera-se em estado “Atrasado”.

Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto)

Tabela 24: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	-	-	1
6	Grupo B	-	3	-	-	3	9
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
8*	Total	-	3	-	-	3	11

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (8)

Tabela 25: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1541	Aquisição de equipamentos digitais móveis	N.º	24900	4.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
1545	Ambientes educativos inovadores	N.º	330	4.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
1549	Conceção de MOOCs	N.º	16	4.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 100% dos Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2024, sendo 1 do Grupo A, 6 do Grupo B e 1 do Grupo C. Até ao final do 2.º trimestre de 2025, todos os Marcos e Metas encontram-se “Dentro do Prazo”.

Informação complementar:

1541:

- Até à data, foram adquiridos 20 309 equipamentos digitais móveis (tablets e computadores portáteis) mediante confirmação da listagem atualizada inserida no RP do trimestre em análise, contrariamente aos 20 329 equipamentos reportados no anterior relatório;
- Encontram-se em fase de preparação procedimentos para aquisição de novos equipamentos.

1545:

- Os procedimentos referentes à aquisição de manuais digitais para o ano letivo 2024/2025 (5º ao 10º ano) encontram-se em fase de conclusão, prevendo-se que estes sejam adquiridos no decorrer do 3.º trimestre de 2024;
- Relativamente aos equipamentos associados à implementação de infraestruturas de telecomunicações, foram, até ao 2.º semestre de 2024, adquiridos e instalados um total de 1 022 equipamentos nas Unidades Orgânicas da Região Autónoma dos Açores.

1549:

- Estão disponíveis um total de 12 cursos: 6 para professores e 6 para encarregados de educação;
- Encontram-se em desenvolvimento 6 novos cursos.

Investimento C21-i15-RAA – Aquisição de 2 ferries elétricos (Beneficiário Final – Atlânticoline S.A.)

Tabela 26: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2024

Completo até 1T 2024	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	1	-	1	1
-	Grupo B	-	-	-	-	-	-
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
-	Total	-	-	1*	-	1	1

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2024 (1)

Tabela 27: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
21.40	Assinatura do contrato para a aquisição de dois ferries elétricos para o transporte de passageiros e veículos entre as ilhas de Pico, Faial e São Jorge	-	-	1.ºT 2024	A	Marco	NC	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

O segundo procedimento para construção de dois ferries elétricos foi lançado a 26 de abril de 2024, tendo o prazo para apresentação de propostas terminado a 11 de junho de 2024. Foram recebidas três propostas, das quais duas foram excluídas e uma aprovada.

Neste momento, aguarda-se emissão do relatório final. Após a sua emissão com decisão de adjudicação, o mesmo será publicado na plataforma AcinGov, em conjunto com a minuta de contrato. De seguida, findo o prazo de audiência prévia e não havendo contestação face ao conteúdo do contrato, este será assinado e, posteriormente, encaminhado para o Tribunal de Contas para obtenção do visto. Assim, prevê-se que o contrato seja assinado no decorrer do 3.º trimestre de 2024.

MARCOS E METAS “A” REPROGRAMADAS

No âmbito da reprogramação do PRR, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia, respetivamente, avaliaram positivamente e adotaram uma nova [Decisão de Execução do Conselho \(CID\)](#), a qual inclui alterações em 18 Metas A nos atuais 11 investimentos do PRR-Açores, as quais estão incluídas no [Anexo Revisto da Decisão de Execução do Conselho](#).

As 18 alterações estão expressas na tabela seguinte, estando relacionadas com 7 investimentos, consistindo na alteração da ambição (7), alteração do prazo (9), eliminação de 1 meta e introdução de 1 nova meta.

Tabela 28: Marcos e Metas Reprogramadas

Original				Reprogramação					
M&M	Invest.	Nome	Obj.	Calendário		Nome	Obj.	Calendário	
				T	Ano			T	Ano
2.15	C02-i04-RAA	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – construção de edifícios	70	4T	2023	Eliminada			
2.16	C02-i04-RAA	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – renovação	318	4T	2023	=	101	=	=
2.17	C02-i04-RAA	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – construção de edifícios	277	4T	2025	=	100	=	=
2.18	C02-i04-RAA	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – renovação	551	4T	2025	=	602	=	=
3.12	C03-i04-RAA	Formação para famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção	13 000	4T	2025	Formação para membros de famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção	4 000	=	=
3.13	C03-i04-RAA	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais (CAO)	207	4T	2024	Novas vagas para pessoas com deficiência em centros de cuidados de apoio a pessoas com deficiência	=	2T	2026
3.15	C03-i04-RAA	Projeto "Ageing Place"	250	4T	2025	=	425	=	=
5.19	C05-i05-RAA	Estruturas novas (para substituir estruturas obsoletas) ou requalificadas para o abate de animais e certificação da qualidade do leite e	3	2T	2024	=	=	4T	2025

		da segurança dos alimentos							
5.21	C05-i05-RAA	Projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas	200	4T	2025	=	178	=	=
7.14	C07-i05-RAA	Contrato assinado para 8 projetos rodoviários	8	2T	2023	=	=	4T	=
7.15	C07-i05-RAA	Estradas construídas ou reabilitadas	34,38	4T	2025	=	=	2T	2026
10.8	C10-i04-RAA	Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC		4T	2022	=	=	=	2023
10.10	C10-i04-RAA	Operacionalização de um centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao mar nos Açores (centro MARTEC)		4T	2025	=	=	2T	2026
10.11	C10-i04-RAA	-	-	-	-	Fornecimento de 2 módulos para o novo navio de investigação		2T	2026
14.11	C14-i03-RAA	Capacidade instalada adicional e remodelada para produção de energia geotérmica	17	4T	2025	=	=	2T	2026
14.12	C14-i03-RAA	Produção adicional de eletricidade renovável no Corvo	850	4T	2023	=	=	2T	2024
14.13	C14-i03-RAA	Novos sistemas de armazenamento de energia com baterias e sistemas de gestão de energia na RAA	20	4T	2025	=	=	2T	2026
20.11	C20-i02-RAA	Novos computadores portáteis e tablets para escolas na RAA	24 900	4T	2025	=	31 900	=	=

RESULTADO DA REPROGRAMAÇÃO – INVESTIMENTOS AÇORES

A Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia, respetivamente, avaliaram positivamente e adotaram uma nova [Decisão de Execução do Conselho \(CID\)](#), a qual inclui 7 novos investimentos e alterações financeiras em 5 dos atuais como resultado do reforço da ambição inicial.

O investimento C02-i04-RAA foi dividido em dois, mantendo a dotação total inicial de 60M€ e as 828 intervenções no parque habitacional. Esta alteração foi originada por uma necessidade ajustar as áreas médias das habitações a construir, atendendo aos objetivos fixados inicialmente.

As alterações estão expressas na tabela seguinte:

Tabela 28: Investimentos Açores Reprogramados

Âmbito da Reprogramação					
Investimento	Nome	Tipo	Dotação Original	Valor Adicional	Observações
C02-i04-RAA	Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores	Reprogramado	60M€	-16,28M€	100 habitações construídas 602 habitações renovadas
C02-i07-RAA	Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação	Novo	-	+4,3M€	145 infraestruturas
C02-i08-RAA	Reforço do parque habitacional social	Novo	-	+16,28M€	126 habitações construídas
C03-i04-RAA	Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Reprogramado	35M€	+4,7M€	Aumento ambição "Novos Idosos": + 175 idosos
C03-i07-RAA	Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI)	Novo	-	+11,2M€	91 vagas novas ou reabilitadas
C10-i04-RAA	Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Reprogramado	32M€	+6M€	Aquisição de Módulos para o Navio
C10-i05-RAA	Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor da Pesca e da Aquicultura	Novo	-	+5M€	15 projetos no setor das pescas e da aquicultura
C16-i05-RAA	Capacitação e Transformação Digital das Empresas dos Açores	Novo	-	+22M€	350 projetos no âmbito Sistema de Incentivos
C19-i06-RAA	Transição Digital da Administração Pública dos Açores	Reprogramado	25M€	+5,6M€	SIMA + Local Sistema de Controlo e Gestão das Finanças Públicas

C20-i02-RAA	Educação digital (Açores)	Reprogramado	38M€	+5,20M€	Aumento ambição
C21-i10-RAA	Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores	Novo	-	+6M€	Aumento da capacidade de armazenamento de eletricidade instalada para autoconsumo
C21-i15-RAA	Aquisição de 2 ferries elétricos	Novo	-	+25M€	Ferries elétricos para transporte de passageiros e veículos entre as ilhas de Pico, Faial e São Jorge

Legenda:

Reprogramado: investimento com valor adicional para aumento da ambição;

Novo: investimento novo aprovado no âmbito do processo de Reprogramação.



GOVERNO
DOS AÇORES



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU
